
































ID	Režim úkolu	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Předchůdci
1	✦	Podpis SoD	0 dny	15.03. 21	15.03. 21	
2	✦?	Regenerace zchátralého mlýna v centru Chabařovic				
3	✦	Předání převzetí staveniště	1 den	23.03. 21	23.03. 21	
4	✦?	Milník č. 1: Předání a převzetí pracoviště				
5	✦	Zařízení staveniště - vytyčení ing. Sí	30 dny	24.03. 21	04.05. 21	
6	✦?	Demolice				
7	✦	Demontáž azbestu (krytina)	9 dny	14.05. 21	26.05. 21	
8	✦	Demolice objektu (svislé konstrukce), objekt C,D,E,G	15 dny	05.06. 21	24.06. 21	
9	✦?	Milník č. 2: dokončení bouracích prací, odstranění části budov vč. statického zajištění rekonsruované části objektu				
10	✦	Zemní práce po demolici	10 dny	25.06. 21	08.07. 21	
11	✦?	Přístavba nového objektu				
12	✦	Zemní práce	3 dny	12.07. 21	14.07. 21	
13	✦	Bednění základových pasů	4 dny	14.07. 21	19.07. 21	
14	✦	Montáž armatury do základů	3 dny	19.07. 21	21.07. 21	
15	✦	Betonáž základových pasů	1 den	22.07. 21	22.07. 21	
16	✦	Odbednění základových pasů	2 dny	23.07. 21	26.07. 21	
17	✦?	Milník č. 3 dokončení základů na nově přistavované budově technického zázemí budoucího objektu				
18	✦	Zásyp základové desky	2 dny	27.07. 21	28.07. 21	

Projekt: HMG Reko mlýn Chaba
Datum: 25.04. 22

Úkol	
Rozdělení	
Milník	
Souhrnný	
Souhrn projektu	
Neaktivní úkol	
Neaktivní milník	
Neaktivní souhrn	
Ruční úkol	
Pouze s dobou trvání	
Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu	
Ruční souhrn	
Pouze zahájení	
Pouze s datem dokončení	
Vnější úkoly	
Vnější milník	
Konečný termín	
Průběh	
Průběh ručně zadaného úkolu	
















ID	Režim úkolu	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Předchůdci
19	➤	Montáž ležaté ZTI	3 dny	28.07. 21	30.07. 21	
20	➤	Bednění obvodových stěn + vložení KARI sítě do desky	4 dny	30.07. 21	04.08. 21	
21	➤	Betonáž základové desky	1 den	02.08. 21	02.08. 21	
22	➤	Odbednění základové desky	1 den	03.08. 21	03.08. 21	
23	➤	Radonová izolace	1 den	04.08. 21	04.08. 21	
24	➤	Zdění obvodového zdiva 1 np	7 dny	05.08. 21	13.08. 21	
25	➤	Bednění věnce + strop	6 dny	13.08. 21	20.08. 21	
26	➤	Montáž stropní armatury	4 dny	20.08. 21	25.08. 21	
27	➤	Betonáž stropu 1np	1 den	26.08. 21	26.08. 21	
28	➤	Zdění obvodového zdiva 2np	6 dny	27.08. 21	03.09. 21	
29	➤	Bednění věnce + strop	6 dny	06.09. 21	13.09. 21	
30	➤	Montáž stropní armatury 2np	4 dny	14.09. 21	17.09. 21	
31	➤	Betonáž stropu 2 np	1 den	18.09. 21	18.09. 21	
32	➤	Zdění obvodového zdiva 3 np	4 dny	20.09. 21	23.09. 21	
33	➤	Bednění věnce 3 np	3 dny	23.09. 21	27.09. 21	
34	➤	Montáž armatury věnce 3 np	2 dny	27.09. 21	28.09. 21	
35	➤	Betonáž věnce 3np + schodiště 1np	1 den	29.09. 21	29.09. 21	
36	➤	Bednění schodiště 1np	4 dny	20.09. 21	23.09. 21	
37	➤	Armování schodiště 1np	3 dny	23.09. 21	27.09. 21	
38	➤	Odbednění stropu 1 np	2 dny	13.09. 21	14.09. 21	
39	➤	Zdění vnitřních příček 1 np	6 dny	15.09. 21	22.09. 21	
40	➤	Bednění schodiště 2 np	4 dny	27.09. 21	30.09. 21	
41	➤	Armování schodiště 2np	2 dny	30.09. 21	01.10. 21	
42	➤	Betonáž schodiště 2 np	1 den	02.10. 21	02.10. 21	
43	➤	Odbednění stropu 2 np	2 dny	07.10. 21	08.10. 21	

Projekt: HMG Reko mlýn Chaba
Datum: 25.04. 22

Úkol	
Rozdělení	
Milník	
Souhrnný	
Souhrn projektu	
Neaktivní úkol	
Neaktivní milník	
Neaktivní souhrn	
Ruční úkol	
Pouze s dobou trvání	
Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu	
Ruční souhrn	
Pouze zahájení	
Pouze s datem dokončení	
Vnější úkoly	
Vnější milník	
Konečný termín	
Průběh	
Průběh ručně zadaného úkolu	

















ID	Režim úkolu	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Předchůdci
44	✦	Zdění vnitřních přiček 2 np	6 dny	08.10. 21	15.10. 21	
45	✦	Montáž krovu	48 dny	04.10. 21	08.12. 21	
46	✦	Montáž krytiny + klempířské prvky	56 dny	15.11. 21	31.01. 22	
47	✦	Provedení tepelné izolace kolem objektu	4 dny	10.08. 21	13.08. 21	
48	✦	Provedení drenážního potrubí kolem obj.	10 dny	16.08. 21	27.08. 21	
49	✦	Provedení zemničího pásku kolem obj.	2 dny	26.08. 21	27.08. 21	
50	✦	Montáž okeních výplní hliník	91 dny	27.09. 21	31.01. 22	
51	✦	Montáž ZTI - rozvody	96 dny	20.09. 21	31.01. 22	
52	✦	Rozvody elektro	96 dny	20.09. 21	30.01. 22	
53	✦	Rozvody UT	96 dny	20.09. 21	30.01. 22	
54	✦	Provedení vnitřních omítek	55 dny	18.10. 21	31.12. 21	
55	✦	Provedení izolace tepelné	30 dny	15.11. 21	24.12. 21	
56	✦	Provedení SDK	27 dny	24.11. 21	30.12. 21	
57	✦	Provedení hrubých podlah	11 dny	11.10. 21	25.10. 21	
58	✦	Montáž obkladů dlažby	24 dny	25.04. 22	26.05. 22	
59	✦	Provedení vnější fasády	133 dny	01.11. 21	04.05. 22	
60	✦	Montáž zámečnických prvků	110 dny	22.11. 21	22.04. 22	
61	✦	Kompletace elektro	15 dny	25.04. 22	13.05. 22	
62	✦	Kompletace ZTI	10 dny	02.05. 22	13.05. 22	
63	✦	Kompletace UT	13 dny	01.04. 22	19.04. 22	
64	✦	Montáž truhlářských výrobků	10 dny	16.05. 22	27.05. 22	
65	✦	Malby	20 dny	20.04. 22	17.05. 22	
66	✦?	Stávající objekt				

Projekt: HMG Reko mlýn Chaba
Datum: 25.04. 22

Úkol	
Rozdělení	
Milník	
Souhrnný	
Souhrn projektu	
Neaktivní úkol	
Neaktivní milník	
Neaktivní souhrn	
Ruční úkol	
Pouze s dobou trvání	
Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu	
Ruční souhrn	
Pouze zahájení	
Pouze s datem dokončení	
Vnější úkoly	
Vnější milník	
Konečný termín	
Průběh	
Průběh ručně zadaného úkolu	
















ID	Režim úkolu	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Předchůdci
67	✦	Zemní práce kolem stávajícího objektu	3 dny	23.06. 21	25.06. 21	
68	✦	Provedení sanace základového zdiva	40 dny	25.06. 21	19.08. 21	
69	✦	Zateplení + hydroizolace	10 dny	21.07. 21	03.08. 21	
70	✦	Provedení drenáže objektu	10 dny	07.07. 21	20.07. 21	
71	✦	Bourací práce	15 dny	23.06. 21	13.07. 21	
72	✦	Betonáž podkladového betonu 1 n	5 dny	03.08. 21	09.08. 21	
73	✦	Odstranění a zabetonování váhy	6 dny	08.07. 21	15.07. 21	
74	✦	ZTI 1 np	3 dny	28.07. 21	30.07. 21	
75	✦	Dodatečné vyzdívky a zazdívky otvorů	10 dny	29.06. 21	12.07. 21	
76	✦	Podlahy 2 np	20 dny	09.08. 21	03.09. 21	
77	✦	Podlahy 3 np	98 dny	01.09. 21	14.01. 22	
78	✦	SDK konstrukce	96 dny	20.09. 21	31.01. 22	
79	✦	Rozvod elektro	104 dny	02.08. 21	23.12. 21	
80	✦	Montáž ZTI rozvody	104 dny	02.08. 21	23.12. 21	
81	✦	Montáž VZT	105 dny	02.08. 21	24.12. 21	
82	✦	Provedení vnitřních omítek	112 dny	18.08. 21	20.01. 22	
83	✦	Rozvody UT	55 dny	11.10. 21	24.12. 21	
84	✦	Montáž obkladů	20 dny	08.04. 22	05.05. 22	
85	✦	Malby	14 dny	12.04. 22	29.04. 22	
86	✦	Dlažby a povlakové krytiny	30 dny	26.04. 22	06.06. 22	
87	✦	Sanace schodiště	10 dny	19.05. 22	01.06. 22	
88	✦	Montáž krovu	123 dny	28.06. 21	15.12. 21	
89	✦	Montáž krytiny + klempířských prv	117 dny	20.08. 21	31.01. 22	
90	✦	Svázání objektu	15 dny	26.07. 21	13.08. 21	



Projekt: HMG Reko mlýn Chaba
Datum: 25.04. 22

Úkol	
Rozdělení	
Milník	
Souhrnný	
Souhrn projektu	
Neaktivní úkol	
Neaktivní milník	
Neaktivní souhrn	
Ruční úkol	
Pouze s dobou trvání	
Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu	
Ruční souhrn	
Pouze zahájení	
Pouze s datem dokončení	
Vnější úkoly	
Vnější milník	
Konečný termín	
Průběh	
Průběh ručně zadaného úkolu	

ID	Režim úkolu	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Předchůdci
91	✦	Montáž dřevěných oken	103 dny	23.08. 21	12.01. 22	
92	✦	Vnější omítky vč. reprofilace říms, šambrán	207 dny	16.08. 21	31.05. 22	
93	✦	Splašková a dešťová kanalizace	25 dny	02.08. 21	03.09. 21	
94	✦	Přípojka plynovodu	10 dny	23.08. 21	03.09. 21	
95	✦	Přípojka elektro	202 dny	23.08. 21	31.05. 22	
96	✦	Přípojka VO	136 dny	23.08. 21	28.02. 22	
97	✦	Přípojka pitné vody	183 dny	02.08. 21	13.04. 22	
98	✦	Montáž VO	10 dny	25.05. 22	07.06. 22	
99	✦	Komunikace a zpevněné plochy	37 dny	06.05. 22	27.06. 22	
100	✦	Sadové úpravy	10 dny	23.05. 22	03.06. 22	
101	✦	Milník č. 5: umožnění zahájení prací Objednatelem na vnitřním vybavení a interiéru objektu	1 den	31.05. 21	31.05. 21	
102	✦	Milník č. 6: provedení závěrečné kontrolní prohlídky stavby příslušným stavebním orgánem	1 den	29.06. 21	29.06. 21	
103	✦	Milník č. 7: ukončení díla a jeho předání a převzetí	1 den	28.05. 21	28.05. 21	
104	✦	Úklid staveniště	10 dny	09.06. 22	22.06. 22	
105	✦	Předání investorovi	1 den	30.06. 22	30.06. 22	

Projekt: HMG Reko mlýn Chaba
Datum: 25.04. 22

Úkol	
Rozdělení	
Milník	
Souhrnný	
Souhrn projektu	
Neaktivní úkol	
Neaktivní milník	
Neaktivní souhrn	
Ruční úkol	
Pouze s dobou trvání	
Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu	
Ruční souhrn	
Pouze zahájení	
Pouze s datem dokončení	
Vnější úkoly	
Vnější milník	
Konečný termín	
Průběh	
Průběh ručně zadaného úkolu	

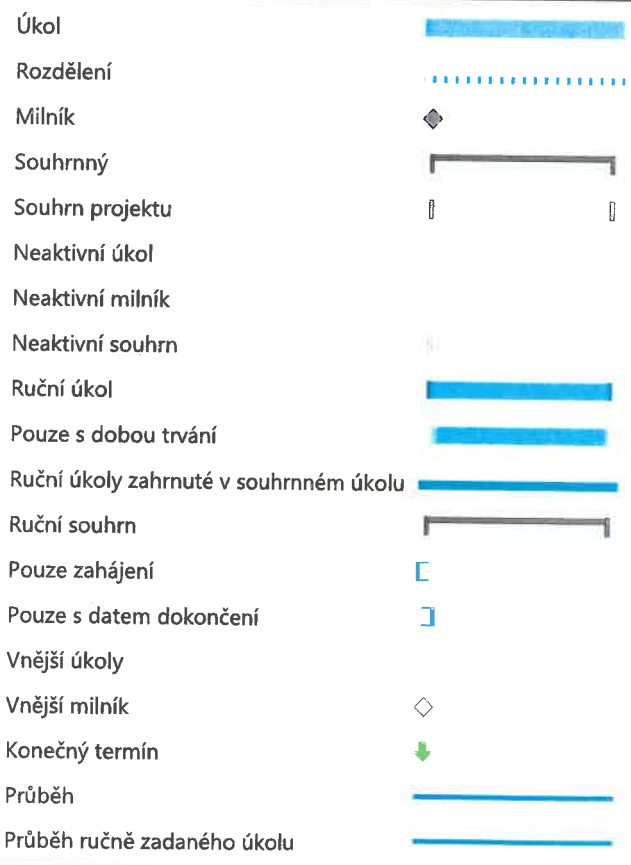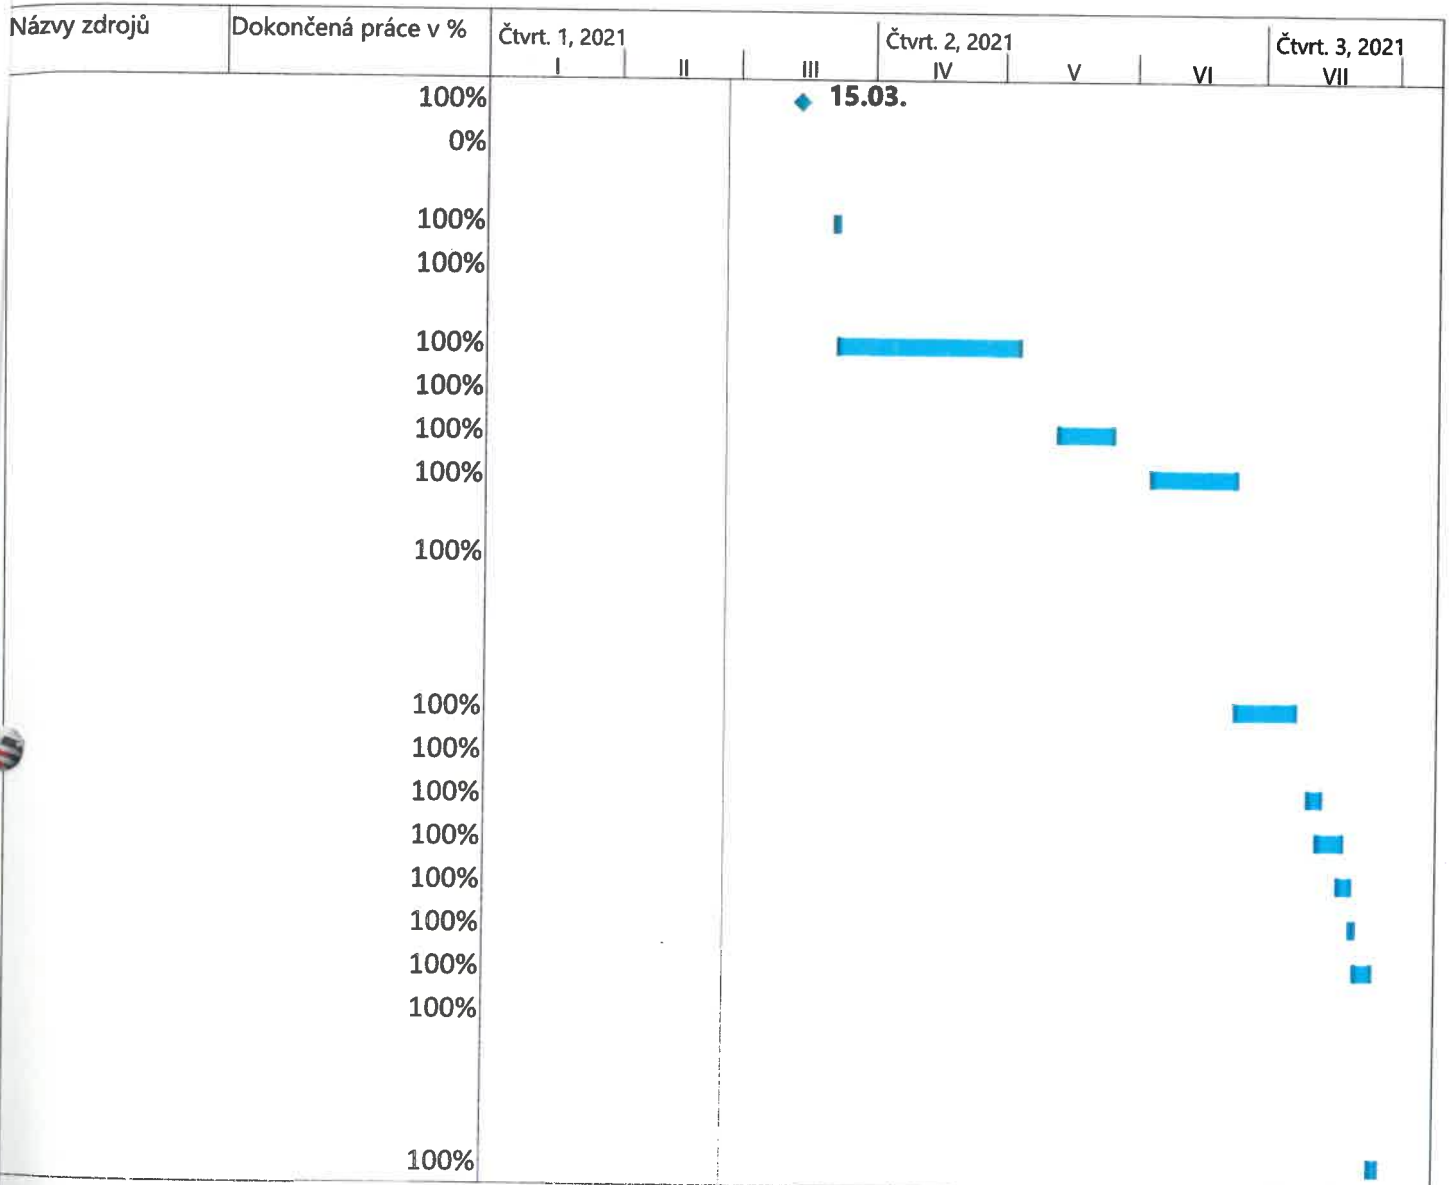
















Projekt: HMG Reko mlýn Chaba
Datum: 25.04. 22

Názvy zdrojů	Dokončená práce v %	Čtvrt. 1, 2021			Čtvrt. 2, 2021			Čtvrt. 3, 2021
		I	II	III	IV	V	VI	VII
	100%							
	100%							■
	100%							■
	100%							■
	100%							■
	100%							■
	100%							■
	100%							■
	100%							■
	100%							■
	100%							■
	100%							■
	100%							■
	100%							■
	100%							■
	100%							■
	100%							■
	100%							■
	100%							■
	100%							■
	100%							■
	100%							■
	100%							■
	100%							■
	100%							■
	100%							■
	100%							■
	100%							■
	100%							■
	100%							■
	100%							■
	100%							■

Úkol	
Rozdělení	
Milník	
Souhrnný	
Souhrn projektu	
Neaktivní úkol	
Neaktivní milník	
Neaktivní souhrn	
Ruční úkol	
Pouze s dobou trvání	
Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu	
Ruční souhrn	
Pouze zahájení	
Pouze s datem dokončení	
Vnější úkoly	
Vnější milník	
Konečný termín	
Průběh	
Průběh ručně zadaného úkolu	

Projekt: HMG Reko mlýn Chaba
Datum: 25.04. 22

Názvy zdrojů	Dokončená práce v %	Čtvrt. 1, 2021			Čtvrt. 2, 2021			Čtvrt. 3, 2021
		I	II	III	IV	V	VI	VII
	100%							
	100%							
	55%							
	100%							
	100%							
	100%							
	100%							
	100%							
	100%							
	100%							
	100%							
	0%							
	80%							
	50%							
	0%							
	0%							
	90%							
	0%							
	0%							
	0%							

	Úkol	
	Rozdělení	
	Milník	
	Souhrnný	
	Souhrn projektu	
	Neaktivní úkol	
	Neaktivní milník	
	Neaktivní souhrn	
	Ruční úkol	
	Pouze s dobou trvání	
	Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu	
	Ruční souhrn	
	Pouze zahájení	
	Pouze s datem dokončení	
	Vnější úkoly	
	Vnější milník	
	Konečný termín	
	Průběh	
	Průběh ručně zadaného úkolu	

Projekt: HMG Reko mlýn Chaba
Datum: 25.04. 22
















Názvy zdrojů	Dokončená práce v %	Čtvrť. 1, 2021			Čtvrť. 2, 2021			Čtvrť. 3, 2021
		I	II	III	IV	V	VI	VII
	100%							
	100%							
	100%							
	100%							
	100%							
	100%							
	100%							
	100%							
	100%							
	100%							
	100%							
	100%							
	100%							
	100%							
	100%							
	25%							
	10%							
	0%							
	0%							
	100%							
	100%							
	100%							

Úkol	
Rozdělení	
Milník	
Souhrnný	
Souhrn projektu	
Neaktivní úkol	
Neaktivní milník	
Neaktivní souhrn	
Ruční úkol	
Pouze s dobou trvání	
Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu	
Ruční souhrn	
Pouze zahájení	
Pouze s datem dokončení	
Vnější úkoly	
Vnější milník	
Konečný termín	
Průběh	
Průběh ručně zadaného úkolu	




















Projekt: HMG Reko mlýn Chaba
Datum: 25.04. 22


Názvy zdrojů	Dokončená práce v %	Čtvrť 1, 2021			Čtvrť 2, 2021			Čtvrť 3, 2021
		I	II	III	IV	V	VI	VII
	100%							
	75%							
	100%							
	100%							
	0%							
	100%							
	100%							
	0%							
	40%							
	0%							
	0%							
	0%							
	0%							
	0%							
	0%							
	0%							

Projekt: HMG Reko mlýn Chaba
Datum: 25.04. 22

- Úkol 
- Rozdělení 
- Milník 
- Souhrnný 
- Souhrn projektu 
- Neaktivní úkol
- Neaktivní milník
- Neaktivní souhrn
- Ruční úkol 
- Pouze s dobou trvání 
- Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu 
- Ruční souhrn 
- Pouze zahájení 
- Pouze s datem dokončení 
- Vnější úkoly
- Vnější milník 
- Konečný termín 
- Průběh 
- Průběh ručně zadaného úkolu 


Projekt: HMG Reko mlýn Chaba
 Datum: 25.04.22

Úkol	
Rozdělení	
Milník	
Souhrnný	
Souhrn projektu	
Neaktivní úkol	
Neaktivní milník	
Neaktivní souhrn	
Ruční úkol	
Pouze s dobou trvání	
Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu	
Ruční souhrn	
Pouze zahájení	
Pouze s datem dokončení	
Vnější úkoly	
Vnější milník	
Konečný termín	
Průběh	
Průběh ručně zadaného úkolu	

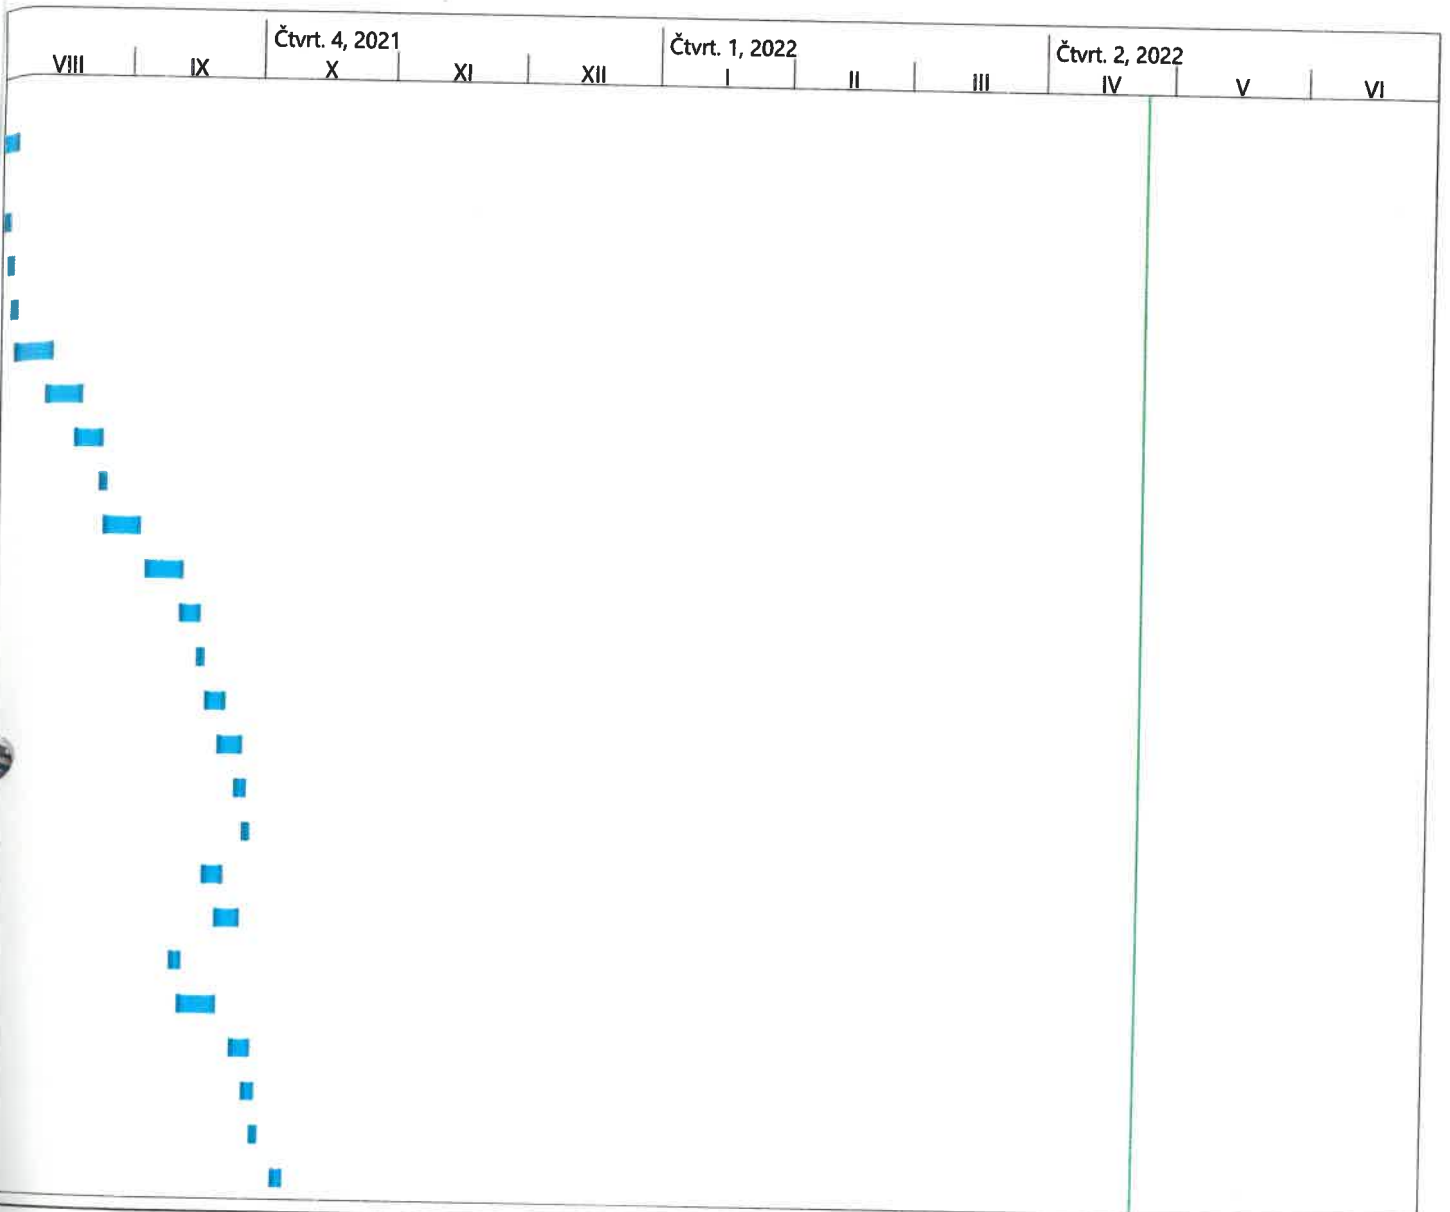


Projekt: HMG Reko mlýn Chaba
Datum: 25.04. 22

Úkol	
Rozdělení	
Milník	
Souhrnný	
Souhrn projektu	
Neaktivní úkol	
Neaktivní milník	
Neaktivní souhrn	
Ruční úkol	
Pouze s dobou trvání	
Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu	
Ruční souhrn	
Pouze zahájení	
Pouze s datem dokončení	
Vnější úkoly	
Vnější milník	
Konečný termín	
Průběh	
Průběh ručně zadaného úkolu	

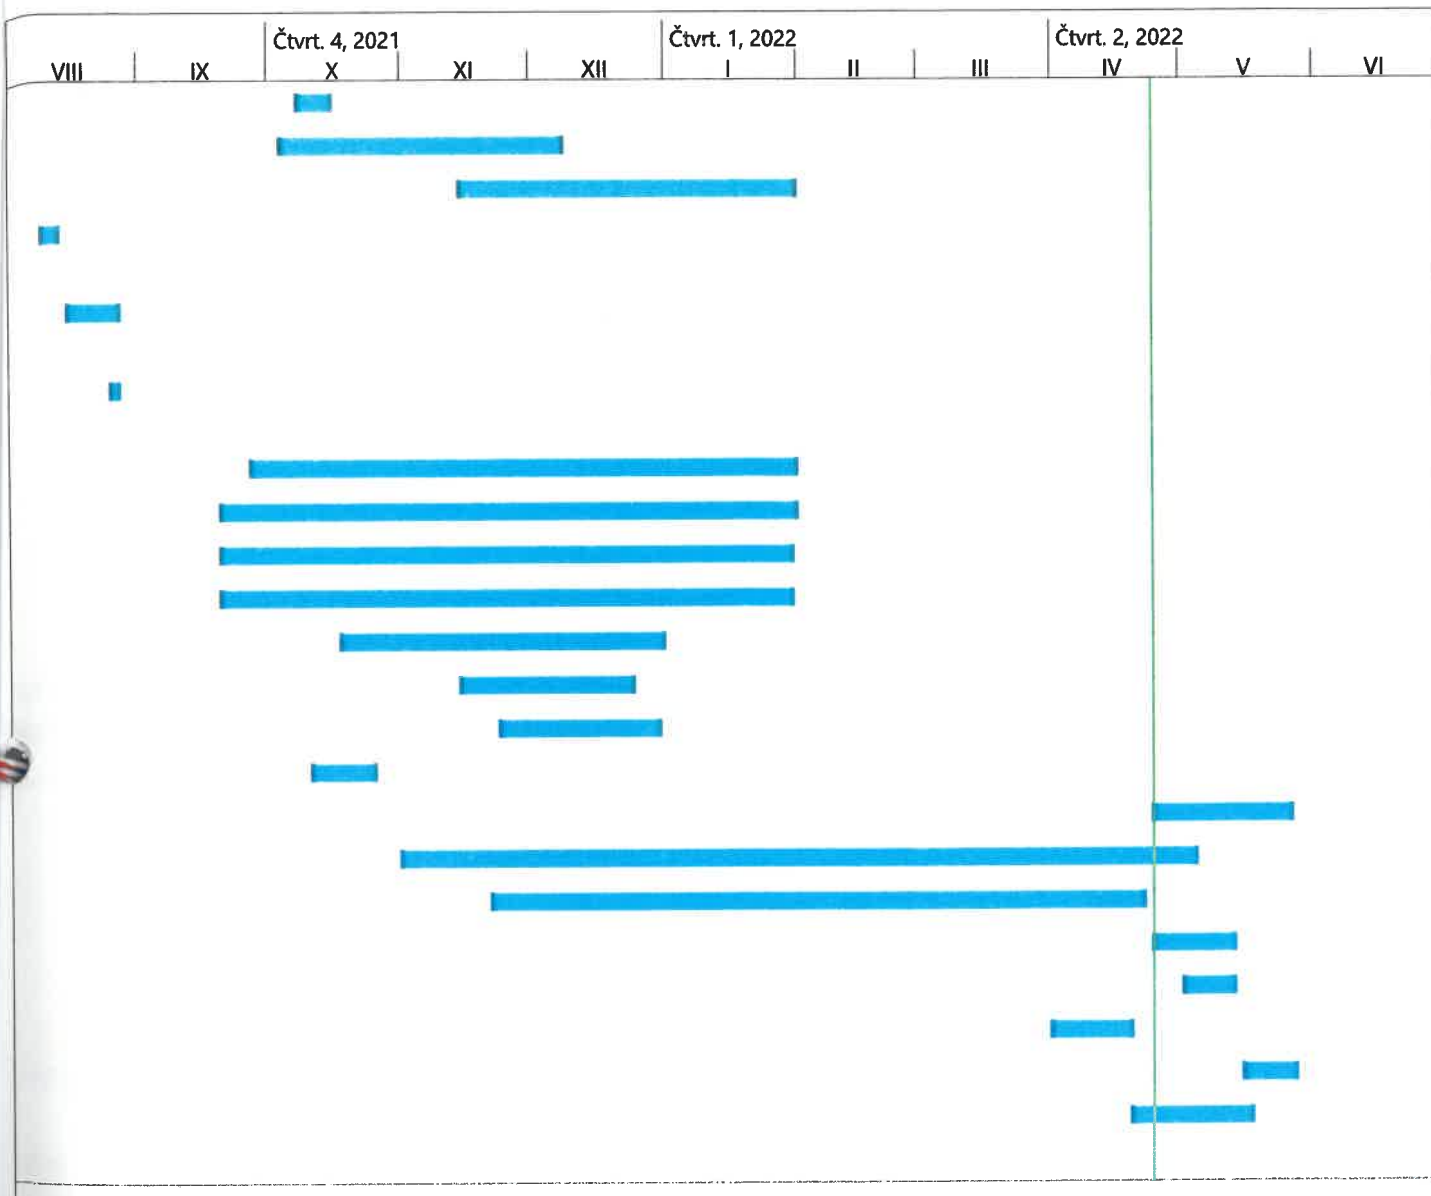


Projekt: HMG Reko mlýn Chaba
Datum: 25.04. 22

Úkol	
Rozdělení	
Milník	
Souhrnný	
Souhrn projektu	
Neaktivní úkol	
Neaktivní milník	
Neaktivní souhrn	
Ruční úkol	
Pouze s dobou trvání	
Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu	
Ruční souhrn	
Pouze zahájení	
Pouze s datem dokončení	
Vnější úkoly	
Vnější milník	
Konečný termín	
Průběh	
Průběh ručně zadaného úkolu	

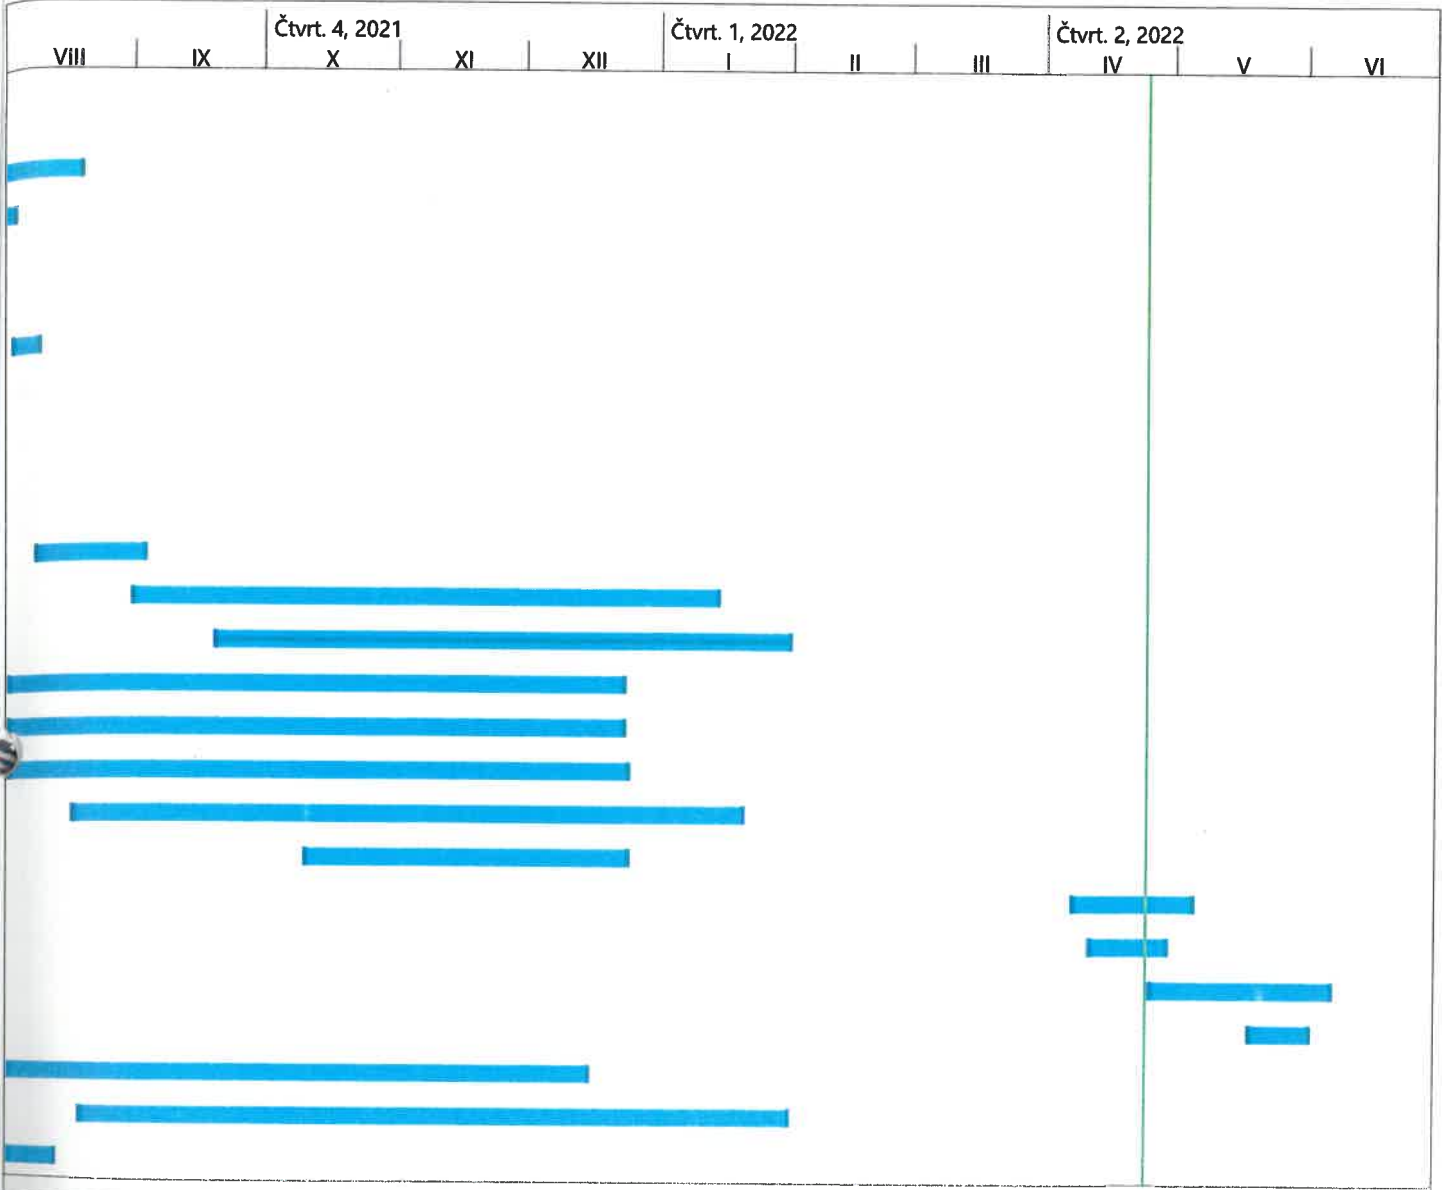

Úkol	
Rozdělení	
Milník	
Souhrnný	
Souhrn projektu	
Neaktivní úkol	
Neaktivní milník	
Neaktivní souhrn	
Ruční úkol	
Pouze s dobou trvání	
Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu	
Ruční souhrn	
Pouze zahájení	
Pouze s datem dokončení	
Vnější úkoly	
Vnější milník	
Konečný termín	
Průběh	
Průběh ručně zadaného úkolu	

Projekt: HMG Reko mlýn Chaba
Datum: 25.04. 22

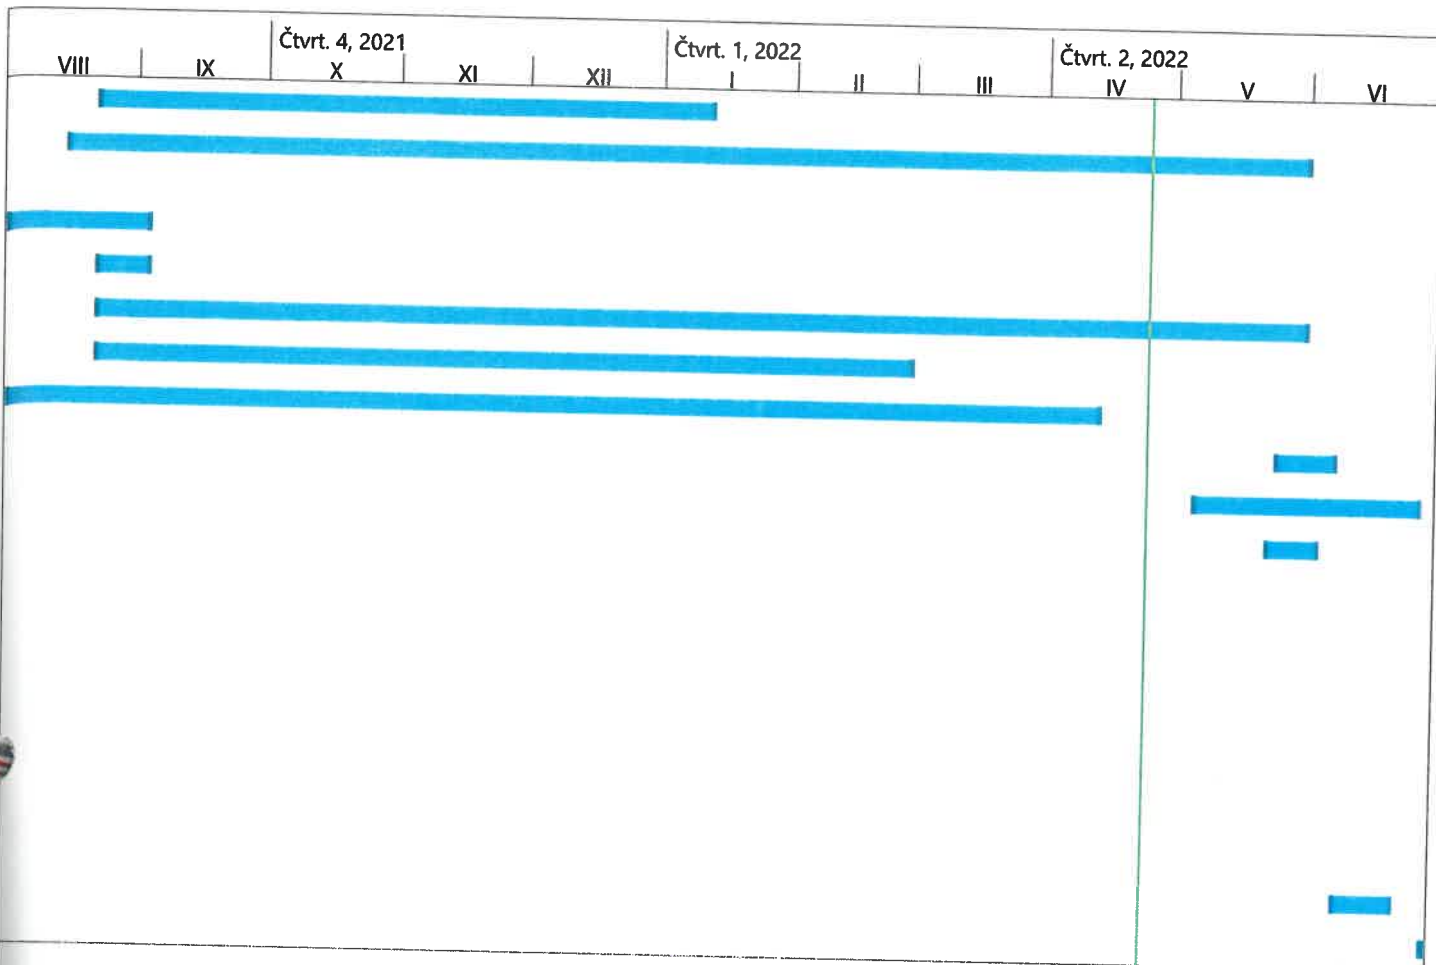
















Projekt: HMG Reko mlýn Chaba
Datum: 25.04. 22

Úkol	[Blue bar]
Rozdělení	[Dotted blue bar]
Milník	◆
Souhrnný	[Bracket]
Souhrn projektu	[Vertical bars]
Neaktivní úkol	
Neaktivní milník	
Neaktivní souhrn	[Vertical bar]
Ruční úkol	[Blue bar]
Pouze s dobou trvání	[Blue bar]
Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu	[Blue bar]
Ruční souhrn	[Bracket]
Pouze zahájení	[Left bracket]
Pouze s datem dokončení	[Right bracket]
Vnější úkoly	
Vnější milník	◇
Konečný termín	↓
Průběh	[Blue bar]
Průběh ručně zadaného úkolu	[Blue bar]
















	Čtvr. 3, 2022			Čtvr. 4, 2022			Čtvr. 1, 2023			Čtvr. 2, 2023		
VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV		

Projekt: HMG Reko mlýn Chaba
Datum: 25.04. 22

Úkol	
Rozdělení	
Milník	
Souhrnný	
Souhrn projektu	
Neaktivní úkol	
Neaktivní milník	
Neaktivní souhrn	
Ruční úkol	
Pouze s dobou trvání	
Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu	
Ruční souhrn	
Pouze zahájení	
Pouze s datem dokončení	
Vnější úkoly	
Vnější milník	
Konečný termín	
Průběh	
Průběh ručně zadaného úkolu	















VI	Čtvr. 3, 2022 VII	VIII	IX	Čtvr. 4, 2022 X	XI	XII	Čtvr. 1, 2023 I	II	III	Čtvr. 2, 2023 IV

Projekt: HMG Reko mlýn Chaba
Datum: 25.04. 22

Úkol	
Rozdělení	
Milník	
Souhrnný	
Souhrn projektu	
Neaktivní úkol	
Neaktivní milník	
Neaktivní souhrn	
Ruční úkol	
Pouze s dobou trvání	
Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu	
Ruční souhrn	
Pouze zahájení	
Pouze s datem dokončení	
Vnější úkoly	
Vnější milník	
Konečný termín	
Průběh	
Průběh ručně zadaného úkolu	
















VI	Čtvrť. 3, 2022 VII	VIII	IX	Čtvrť. 4, 2022 X	XI	XII	Čtvrť. 1, 2023 I	II	III	Čtvrť. 2, 2023 IV

Projekt: HMG Reko mlýn Chaba
Datum: 25.04. 22

Úkol	
Rozdělení	
Milník	
Souhrnný	
Souhrn projektu	
Neaktivní úkol	
Neaktivní milník	
Neaktivní souhrn	
Ruční úkol	
Pouze s dobou trvání	
Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu	
Ruční souhrn	
Pouze zahájení	
Pouze s datem dokončení	
Vnější úkoly	
Vnější milník	
Konečný termín	
Průběh	
Průběh ručně zadaného úkolu	

VI	Čtvr. 3, 2022 VII	VIII	IX	Čtvr. 4, 2022 X	XI	XII	Čtvr. 1, 2023 I	II	III	Čtvr. 2, 2023 IV

Projekt: HMG Reko mlýn Chaba
Datum: 25.04. 22

Úkol	
Rozdělení	
Milník	
Souhrnný	
Souhrn projektu	
Neaktivní úkol	
Neaktivní milník	
Neaktivní souhrn	
Ruční úkol	
Pouze s dobou trvání	
Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu	
Ruční souhrn	
Pouze zahájení	
Pouze s datem dokončení	
Vnější úkoly	
Vnější milník	
Konečný termín	
Průběh	
Průběh ručně zadaného úkolu	

VI	Čtvrť. 3, 2022 VII	VIII	IX	Čtvrť. 4, 2022 X	XI	XII	Čtvrť. 1, 2023 I	II	III	Čtvrť. 2, 2023 IV

Projekt: HMG Reko mlýn Chaba
Datum: 25.04. 22

Úkol	
Rozdělení	
Milník	
Souhrnný	
Souhrn projektu	
Neaktivní úkol	
Neaktivní milník	
Neaktivní souhrn	
Ruční úkol	
Pouze s dobou trvání	
Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu	
Ruční souhrn	
Pouze zahájení	
Pouze s datem dokončení	
Vnější úkoly	
Vnější milník	
Konečný termín	
Průběh	
Průběh ručně zadaného úkolu	
