

POZNÁMKA :
- OBJEKTY "E, D, C" SE BUDOU BOURAT HYDRAULICKÝMI BOURACÍMI NŮŽKAMI POSTUPNÝM ROZEBRÁNÍM OD SHORA. HYDRAULICKÉ NŮŽKY BUDOU UMÍSTĚNÉ NA PLOŠE DVORA, MIMO PŮDORYS BOURANÝCH OBJEKTŮ, NEBUDOU VJÍZDĚT NAD SUTERÉNY.
- NEDOPORUČUJI ROZEBRÁT OBJEKTY RUČNĚ A POMOCÍ RUČNÍHO ELEKTRICKÉHO NÁŘADÍ. VZHLED K POŠKOZENÍ DŘEVĚNÝCH STROPNÍCH KONSTRUKCÍ NENÍ BEZPEČNÝ POHYB OSOB V OBJEKTECH "C, D, E". PŘI TOMTO ZPŮSOBU BY MUSELY BÝT STROPY POSTUPNĚ PODEPRĚNÉ POMOCNOU VÝDŘEVOU, KTERÁ BY SE ZPĚTNĚ BOURALA S BOURANÝMI KONSTRUKCEMI.
- STĚNY NEPODSKLEPENÉHO OBJEKTU C SE ODBOURAJÍ NA ÚROVĚŇ PODLAHY 1.NP. PO ROZEBRÁNÍ VRCHNÍ STAVBY SE OBVODOVÉ SUTERÉNNÍ ZDI OBJEKTŮ D A E ODBOURAJÍ NA ÚROVĚŇ STÁVAJÍCÍ PODLAHY 1.PP. PODLAHY SUTERÉNU, ZÁKLADY POD ÚROVNÍ SUTERÉNU A KANÁL V OBJEKTU E SE PONECHAJÍ. VNITŘNÍ STĚNY SUTERÉNU SE TĚŽ ODBOURAJÍ NA ÚROVĚŇ PODLAHY SUTERÉNU.
- PŘI BOURACÍCH PRACÍCH SE BUDE KONTROLOVAT NÁPOJENÍ VÝCHODNÍ ŠTÍTOVÉ ZDI OBJEKTU C NA OBJEKT B. PONECHÁ SE ŠTÍTOVÁ ZEď C K OBJEKTU B V 1.NP, VE 2.NP A V PODKROVÍ A PODÉLNÉ PILÍŘE DĚLKY 1,2 M. VRCHNÍ ČÁST STĚNY SE ROZEBERE CCA 0,15 M NAD STŘEŠNÍ KRYTINU OBJEKTU B. U DVORNÍHO PRŮČELÍ 1.NP SE PILÍŘ DOZDÍ VYBOURANÝMI CIHLAMI. ŠTÍTOVÁ ZEď SE ZAJISTÍ ŠIKMOU VÝDŘEVOU ZE 3 VYBOURANÝCH TRÁMŮ MINIMÁLNÍHO ROZMĚRU 180/200 MM. VZPĚRY V ÚHLU 45° SE OPŘOU DO KAPES V PODLAZE A DO ŠTÍTOVÉ ZDI V ÚROVNÍ STROPŮ 1.NP.
- VYBOURANÝ MATERIÁL SE ODTĚŽÍ Z PROSTORŮ SKLEPŮ, VYČISTÍ SE I Z KANÁLU POD PODLAHOU OBJEKTU E. PROVĚŘÍ SE NÁVAZNOST KANÁLU, MIMO PŮDORYS OBJEKTU E. KANÁL SE ZASYPE ŠTĚRKEM FRAKCE 32/64, NA KTERÝ SE POLOŽÍ GEOTEXTILIE PROTI SPLAVOVÁNÍ JEMNÝCH ČÁSTÍ Z VRCHNÍCH ZÁSYPŮ. SUTERÉNY SE ZASYPOU PODLE DRUHU POVRCHOVÉ ÚPRAVY STAVEBNÍ ČÁSTI PROJEKTU : PLOCHA KATEGORIE I. BUDE POD ZÁHONY SE STROMY, PLOCHA KATEGORIE II. BUDE POD CHODNÍKY SE ZÁMKOVOU DLAŽBOU A KAŠNOU, PLOCHA KATEGORIE III. BUDE POD ALTÁNEM A POD NOVOU PŘÍSTAVBOU.

- SUTERÉN POD PLOCHOU KATEGORIE I. SE ZASYPE ZEMINOU VHODNOU PRO RŮST STROMŮ, MOCNOST ZEMINY BUDE 1,50 M OD UPRAVENÉHO TERÉNU. SUTERÉN POD PLOCHOU KATEGORIE II. A III. SE ZASYPE TRÍDĚNÝM BETONOVÝM RECYKLÁTEM FRAKCE 0-32 NEBO ŠTĚRKEM OBDOBNÉ FRAKCE. SUTERÉNY SE BUDOU ZASYPÁVAT PO VRSTVÁCH DO 0,20 MM. KAŽDÁ VRSTVA RECYKLÁTU NEBO ŠTĚRKU SE BUDE HUTNIT NA KOEFICIENT ULEHLOSTI $I_1 = 0,90$, KAŽDÁ VRSTVA ZEMINY NA HODNOTU 90% PROCTOR STANDARD. PROTI SEDÁNÍ NÁSPŮ SE PO 0,4 M POLOŽÍ V CELÉ PLOŠE SUTERÉNU GEOMŘÍŽE NEBO ZPEVNŮJÍCÍ KOMPZITNÍ MŘÍŽE Z LISOVANÝCH ČEDIČOVÝCH VLÁKEN.
- OBJEKT G LŽE ZBOURAT POSTUPNÝM ROZEBRÁNÍM OD SHORA BĚŽNOU BOURACÍ MECHANIZACÍ. VYBOURAJÍ SE BETONOVÉ PODLAHY A ZÁKLADY DO HLoubKY 1,0 M POD ÚROVĚŇ TERÉNU.
- BETONOVÁ PLOCHA DVORA SE VYBOURÁ TĚŽKÝM BOURACÍM PNEUMATICKÝM KLADIVEM.
- PŘI BOURÁNÍ OBJEKTŮ POMOCÍ HYDRAULICKÝCH NŮŽEK NEBUDOU PODPĚRNÉ KONSTRUKCE POTŘEBNÉ.
- PŘI BOURÁNÍ SE BUDE POSTUPOVAT OD OBJEKTU E → D → C. PŘI JEDNOTLIVÝCH PRACOVNÍCH ZÁBĚRECH BUDE ROZDÍL VŽDY MAXIMÁLNĚ 1 PODLAŽÍ.
STATICKE ZAJIŠTĚNÍ PODROBNĚJI POPSANÉ V SAMOSTATNĚ PŘÍLOZE ING. KARLA STRÁNSKÉHO.


LEGENDA BOURACÍCH PRACÍ :

- 01 - VYBOURÁNÍ NOSNÝCH, OBVODOVÝCH A VNITŘNÍCH KONSTRUKCÍ STĚN Z CIHEL PLNÝCH, ZÁKLADOVÉ ZDIVO SMÍŠENÉ (CIHLA PLNÁ-KÁMEN) VČETNĚ OMÍTEK V PŘEDPOKLÁDANÉM ROZSAHU DLE VÝKRESŮ
- 02 - VYBOURÁNÍ KLENUTÝCH STROPNÍCH KONSTRUKCÍ Z CIHEL PLNÝCH, VČETNĚ BETONOVÉ MAZANINY
- 03 - ROZEBRÁNÍ DŘEVĚNÝCH TRÁMOVÝCH STROPŮ, VČETNĚ NOSNÝCH OCELOVÝCH PROFILŮ, DŘEVĚNÝCH SLOUPŮ A NÁŠLAPNÝCH VRSTEV PRKENNÉ PODLAHY
- 04 - VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH VRSTEV PODLAH CIHELNÉ DLAŽBY NA TERÉNU S NÁŠLAPNOU - VYROVNÁVACÍ VRSTVOU BETONOVÉ MAZANINY
- 05 - ROZEBRÁNÍ PRVKŮ DŘEVĚNÉHO KROVU - POZEDNICE, VAZNICE, KROKVE, PÁSKY, SLOUPKY, VZPĚRY, PRKENNÉ STŘEŠNÍ BEDNĚNÍ, POPŘ. OSTATNÍ TZUŽUJÍCÍ PRVKY.
- 06 - DEMOLICE STÁVAJÍCÍHO KOMÍNOVÉHO TĚLESA Z CIHEL PLNÝCH, VÝŠKOVÉ PROCHÁZEJÍCÍ OBJEKTEM "C" OD SUTERÉNU AŽ NAD STŘEŠNÍ ROVINU
- 07 - VYBOURÁNÍ ZDĚNÉHO ŠTÍTU VČETNĚ KOMÍNU Z CIHEL PLNÝCH V MINULOSTI ZDEMOLOVANÉHO OBJEKTU, KTERÝ JE PŘÍSAZENÝ K JIŽNÍMU ŠTÍTU STÁV. OBJEKTU "D"
- 08 - DEMONTÁŽ VNITŘNÍCH A VNĚJŠÍCH VÝPLNÍ OTVORŮ VČETNĚ OKENNÍCH RÁMŮ A DVEŘNÍCH ZÁRUBNÍ
- 09 - DEMONTÁŽ STŘEŠNÍ KRYTINY Z AZBESTOCEMENTOVÝCH ŠABLON, VČETNĚ STŘEŠNÍCH VÝLEZŮ, STÁV. KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ - LEMOVÁNÍ, OPLECHOVÁNÍ, OKAPOVÝCH ŽLABŮ A SVODŮ
- 10 - VYJMUTÍ STÁV. NOSNÝCH LITINOVÝCH SLOUPŮ BEZ POŠKOZENÍ. SPLUPY BUDOU BEZ SLÁDKY PŘEDÁNY INVESTOROVÍ A POUŽITÝ PRO PLÁNOVANOU REKONSTRUKCI STÁVAJÍCÍHO SOUSEDNÍHO OBJEKTU "B"
- 11 - PONECHÁNÍ STÁV. VÝCHODNÍ ŠTÍTOVÉ STĚNY VČETNĚ PODÉLNÝCH PILÍŘŮ DĚLKY 1,2m. V MÍSTĚ OTVORŮ SE PILÍŘE DOZDÍ. VÝŠKOVÝ ROZSAH OD PŘÍZEMÍ AŽ 0,15m NAD STŘEŠNÍ ROVINU

LEGENDA MATERIÁLŮ - BOURACÍ PRÁCE:

- STÁV. VÝCHODNÍ ŠTÍTOVÁ STĚNA MEZI STÁV. OBJEKTEM "B" A BOURANÝM OBJEKTEM "C" BUDE PONECHÁNA VČETNĚ PODÉLNÝCH PILÍŘŮ DĚLKY 1,2m. VÝŠKOVÝ ROZSAH OD PŘÍZEMÍ AŽ 0,15m NAD STŘEŠNÍ ROVINU. ŠTÍTOVÁ STĚNA SE NOVĚ NAHODÍ A OPLECHUJE.
- NOSNÉ OBVODOVÉ, VNITŘNÍ A PŘÍČKOVÉ ZDIVO STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU Z PLNÝCH CIHEL, STÁV. ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE ZE SMÍŠENÉHO ZDIVA (CIHLA PLNÝ-KÁMEN)
- DOZDÍVKY OTVORŮ STÁV. VNITŘNÍCH A OBVODOVÝCH STĚN V MÍSTĚ ŠTÍTOVÉ STĚNY MEZI STÁV. OBJEKTEM "B" A BOURANÝM OBJEKTEM "C", VČETNĚ KOLMÝCH PILÍŘŮ DĚLKY 1,2m.
- ROSTLÝ TERÉN
- PLOCHA DEMOLICE OBEČNĚ

SCHEMA BOURANÝCH OBJEKTŮ:

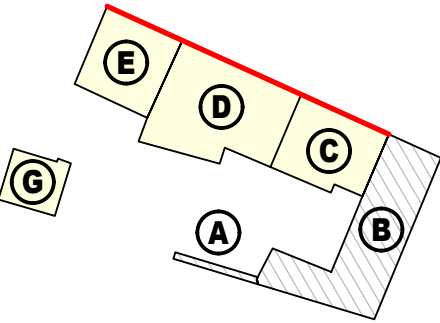

±0,000 = 172,61 Bpv

ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÍ ŘEŠENÍ :		VYPRACOVAL :		KOTIŠ architekt	
KOTIŠ - ARCHITEKT Hradiště 96/8, 400 11 Ustí nad Labem IČO: 402 25 313, DIČ: CZ5809090573		Ing. arch. LUBOŠ KOTIŠ Ing. arch. JIŘÍ P. JANDA p. TOMÁŠ KOFRŇ			
NÁZEV ZAKÁZKY :		PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE OBJEKTU HUSOVO NÁMĚSTÍ 2. (p.p.č. 89, 88/2, 88/3, 88/6, 88/7)		STUPĚŇ :	PARE :
INVESTOR :		MĚSTO CHABAŘOVICE, HUSOVO NÁMĚSTÍ 183, 40317 CHABAŘOVICE		BOURACÍ PRÁCE	
Č. ZAKÁZKY :					
ČÁST :		D.1 - DEMOLICE STÁV. OBJEKTŮ BÝVALÉHO MLÝNA D-1.1. ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		DATUM VYDÁNÍ :	MĚŘÍTKO :
VÝKRES :		POHLED SEVERNÍ - BOURACÍ PRÁCE		02/2019	1:100
				Č. VÝKRESU :	ZMĚNA :
				D.1.1.2.10	
