



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



Smlouva č. 5/0009/had
dodatek č. ke smlouvě č.
Skartační znak/lhůta V15
zodpovídá Ing. Dutkevič dne 13-01-2021
**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

Číslo smlouvy zhotovitele:

Číslo smlouvy objednatele:

SMLOUVA O DÍLO č. 02/2021

na realizaci veřejné zakázky s názvem:

„Rekonstrukce chodníku podél MK Wolkerova v Hulíně – úsek II. – 1. etapa“

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) mezi:

I.

Smluvní strany

Město Hulín

se sídlem: nám. Míru 162, 768 24 Hulín
Osoby oprávněné jednat: Mgr. Roman Hoza, starosta města
Oprávněný zástupce:
- ve věcech smluvních: Mgr. Roman Hoza, starosta města
- ve věcech technických: Ing. Roman Dutkevič, vedoucí odboru RMŽP
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 8319720217/0100
Identifikační číslo: 00287229
DIČ: CZ00287229

dále jen „Objednatel“

Správa a údržba silnic Kroměřížska, s.r.o.

se sídlem: Kotojedy 56, 767 01 Kroměříž
zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 44644

Oprávněný zástupce:
- ve věcech smluvních: Ing. Emil Vraník, jednatel společnosti
- ve věcech technických: Ing. Lukáš Sedláček, vedoucí stavebního střediska

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 86-2246480277/0100
Identifikační číslo: 26908298
DIČ: CZ26908298

dále jen „Zhotovitel“

Dále také obecně jako „smluvní strany“

II.

Základní ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly, že tento závazkový vztah a vztahy z něj vyplývající se řídí zákonem číslo 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů, a to podle ustanovení § 2586 a následujících tohoto zákoníku.
2. Tato smlouva je uzavírána k zabezpečení veřejných potřeb objednatele. Účelem uzavření této smlouvy je zajištění stavby **„Rekonstrukce chodníku podél MK Wolkerova v Hulíně – úsek II – I. etapa“**
3. Předmětem této smlouvy je závazek Zhotovitele realizovat pro Objednatele na základě zadávacího řízení k zakázce s názvem **„Rekonstrukce chodníku podél MK Wolkerova v Hulíně – úsek II – 1. etapa“** za podmínek této smlouvy o dílo – rekonstrukci chodníku podél MK Wolkerova, Hulín – úseky I. a III., rozsah je specifikován v této smlouvě a v jejích přílohách.
4. Zástupci smluvních stran podepisující tuto smlouvu prohlašují:
 - a) že údaje uvedené v čl. I. této smlouvy (dále jen „identifikační údaje“) a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy,
 - b) že Zhotovitel byl vybrán na základě zadávacího řízení na zakázku Objednatele s názvem **„Rekonstrukce chodníku podél MK Wolkerova v Hulíně – úsek II – 1. etapa“**
 - c) že podle vnitřních předpisů nebo jiného obdobného předpisu či rozhodnutí orgánu jsou oprávnění podepsat tuto smlouvu a k platnosti smlouvy ze strany Zhotovitele není potřeba podpisu jiné osoby či dalšího právního úkonu.
5. Smluvní strany se zavazují, že zástupci smluvních stran, podepisující tuto Smlouvu, změny svých identifikačních údajů písemně oznámí (s ověřeným podpisem) bez prodlení druhé smluvní straně.
 - a) Písemné oznámení o změně identifikačních údajů a to včetně změny bankovního spojení smluvní strana zašle k rukám osoby pověřené zastupováním druhé smluvní strany ve věcech technických.
 - b) Písemné oznámení o změně zástupce smluvní strany, podepisujícího tuto Smlouvu, smluvní strana doloží dokladem o volbě nebo jmenování.
 - c) V písemném oznámení smluvní strana vždy uvede odkaz na číslo smlouvy a datum účinnosti oznamované změny.
6. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků Zhotovitele (pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem), a to nejméně ve výši 3.000.000,- Kč coby minimálního limitu pojistné částky. Pojistná smlouva je nedílnou součástí této smlouvy jakožto její Příloha č. 5, další doklady o pojištění je Zhotovitel povinen na požádání Objednateli předložit. Pojistná smlouva, jejímž předmětem je platné a účinné pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí

osobě musí být udržována v platnosti po celou dobu provádění díla. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuté ve sjednané ceně.

7. Zhotovitel výslovně prohlašuje:

- a) že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy,
- b) že se řádně seznámil s projektovou dokumentací stavby a výkazem výměr, přičemž svým podpisem na této smlouvě stvrzuje, že k těmto dokumentům nemá žádné výhrady, jsou mu zcela jasné a srozumitelné a neshledal v nich žádné rozdíly, na které by musel objednatel upozornit,
- c) že se řádně seznámil s místem realizace díla a se všemi dalšími požadavky Objednatel uvedenými v zadávacích podmínkách,
- d) odvede na výstupu daň z přidané hodnoty z plnění dle této smlouvy.

8. Objednatel výslovně prohlašuje, že není v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy osobou povinnou k dani z přidané hodnoty a nebude uplatněn režim přenesené daňové povinnosti podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

III.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje ke zhotovení díla „**Rekonstrukce chodníku podél MK Wolkerova v Hulíně – úsek II – 1. etapa.**“ (dále též „stavba“ nebo „dílo“), v rozsahu podle: projektové dokumentace zpracované **Ing. Ondřejem Adamíkem, bytem Sportovní 3391/12, 796 01 Prostějov, IČ: 04625170** pod číslem zakázky 170A15.

1.1. a to všech jejích částí, které byly součástí zadávacích podmínek;

1.2. podmínek pro provedení stavby stanovených v ohlášení stavby

1.3. obchodních podmínek stanovených touto smlouvou o dílo, zadávací dokumentací a nabídkou Zhotovitele do výběrového řízení;

1.4. podmínek pro realizaci stavby, vyplývajících z vyjádření správce stávajících inženýrských sítí a zařízení dotčených stavbou a z ujednání podle uzavřených smluvních vztahů, které jsou součástí složky „Dokladová část stavby“, která je součástí projektové dokumentace,

1.5. položkového rozpočtu stavby vč. rekapitulace celkových nákladů stavby, zpracovaného zhotovitelem v souladu s výkazy výměr a projektovou dokumentací stavby, v rámci zadávacího řízení na tuto veřejnou zakázku. Položkový rozpočet stavby je součástí této smlouvy jako Příloha č. 1.

2. Zhotovitel jako součást realizace díla zajistí a provede na svůj náklad zejména následující práce a činnosti:

2.1. Před zahájením realizace stavby:

2.1.1. označení staveniště ve smyslu § 152 odst. 3 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů, tj. zřídí a vyvěsí na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek s údaji:

- ohlášení povolení stavby (čj., datum a povolující orgán), o názvu stavby, o názvu Zhotovitele, o názvu investora (Objednatel) a o termínu dokončení stavby; štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy tak, aby údaje na něm uvedené zůstaly

čitelné po celou dobu výstavby s ponecháním údajů uvedených výše do doby kolaudace stavby;

- 2.1.2. vytyčení všech podzemních a nadzemních sítí a technických zařízení v území stavby u příslušných vlastníků a správců; řádné označení a zabezpečení sítí a technických zařízení proti poškození, ohrožení provozu nebo zamezení přístupu k nim po celou dobu výstavby, vyjádření k existenci sítí a zařízení v zájmovém území stavby (dále jen „doklady“) předá Objednatel Zhotoviteli ke dni předání a převzetí staveniště, zhotovitel je povinen, pokud bude potřeba, před vytyčením tato vyjádření aktualizovat;
- 2.1.3. dodržení podmínek obsažených ve stanoviscích správců komunikací, vlastníků a správců dotčených sítí a technických zařízení, která jsou obsahem dokladů, předaných Objednatel Zhotoviteli;
- 2.1.4. provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla;
- 2.1.5. vytyčení prostorové polohy stavby subjektem k tomu oprávněným;
- 2.1.6. zpracování a prokazatelné projednání zásad organizace výstavby (dále jen „ZOV“) a harmonogramu postupu prací členěného dle jednotlivých stavebních objektů, podobjektů a oddílů – výstavby (dále jen „HMG“) se zástupcem Objednatel a dotčenými třetími osobami;
- 2.1.7. zpracování rizik BOZP, technologických a pracovních postupů a následné jejich projednání a odsouhlasení koordinátorem BOZP;
- 2.1.8. zpracování a odsouhlasení kontrolního a zkušebního plánu;
- 2.1.9. pořízení fotodokumentace stávajícího stavu všech stavebních objektů, přilehlých komunikací, pozemků sousedících se stavbou, před zahájením prací a její předání objednateli na el. nosiči dat, přičemž každý snímek bude opatřen číslem a datem pořízení snímku – viz Příloha č. 4 této Smlouvy;
- 2.1.10. zajistí naplnění povinností ze smluv a stanovisek o zajištění přeložek, vyjádření vlastníků pozemků dotčených stavbou, které jsou nedílnou součástí dokladové části,
- 2.1.11. předložení a předání Objednateli, nejpozději ke dni zahájení realizace stavby, doklady v rozsahu ujednání dle této smlouvy o dílo, a to:
 - a) protokoly o vytyčení všech stávajících inženýrských sítí a technických zařízení v zájmovém území stavby a staveniště neprodleně poté, co je od jednotlivých správců sítí obdrží,
 - b) protokol o vytyčení prostorové polohy stavby,
 - c) stavební deník se zápisy, případně samostatné zápisy o projednání a odsouhlasení ZOV a HMG,
 - d) rizika BOZP, technologické a pracovní postupy odsouhlasené koordinátorem BOZP,
 - e) kontrolní a zkušební plán (KZP).

2.2. V průběhu realizace stavby:

- 2.2.1. zřízení napojení na odběrná místa vody a el. energie s podružnými měřidly včetně úhrady za odběr medií, počáteční stav podružných měřidel zhotovitel запиše do stavebního deníku;
- 2.2.2. zřízení zařízení staveniště obsahující provozní, sociální zařízení včetně nezbytného vybavení pro výkon Zhotovitele, technického dozoru investora, autorského dozoru, koordinátora BOZP atd. (suché WC);

- 2.2.3. zajištění bezpečného pevného ohrazení a označení prostoru staveniště a jeho zařízení po celou dobu výstavby;
- 2.2.4. zajištění bezpečného přístupu a příjezdu k jednotlivým nemovitostem přilehlých k místu staveniště;
- 2.2.5. zabezpečení přístupu a příjezdu ke stanovištím kontejnerů-nádob na komunální odpad,
- 2.2.6. provádění stavby mimo dobu od 18:00 do 8:00 hodin a nepřekročení hladiny hluku přes 50 dB,
- 2.2.7. zajištění po celou dobu výstavby údržby a přemísťování přechodného dopravního značení a po dokončení stavby provedení zpětné demontáže a odvozu přechodného dopravního značení,
- 2.2.8. pořízení fotodokumentace průběhu výstavby na el. nosiči (především zakrývaných konstrukcí, vybudovaných inž. sítí, přípojek a chrániček před záhozem, celkový pohled na staveniště), přičemž každý snímek bude opatřen, aktuálním datem;
- 2.2.9. zajištění schůdnosti, sjízdnosti a čištění vozovek, užívaných pro dovoz stavebního materiálu na staveniště a odvoz odpadu ze staveniště, a to po celou dobu výstavby;
- 2.2.10. zajištění odvozu a uložení odpadů vzniklých stavební činností na skládku, včetně uhrazení poplatků za uskladnění, v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, Zhotovitel předá objednateli doklady o uložení množství a kategorie odpadu na řízené skládky, případně předá doklad o předání a převzetí odpadu k recyklaci organizaci (osobě) oprávněné k této činnosti, jako podklad pro uznání fakturace;
- 2.2.11. zabezpečení plnění podmínek pro realizaci stavby, stanovených správcí inženýrských sítí a zařízení dotčených stavbou, obsažených v předané složce „Dokladová část stavby“; o kontrolách vč. předání sítí a zařízení před záhozem Zhotovitel provede s příslušnými správcí dotčených sítí a zařízení zápis do stavebního deníku; provede úpravy požadované jednotlivými správcí a vlastníky dotčených sítí a zařízení;
- 2.2.12. kontrolu dodržování bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí;
- 2.2.13. průběžná řešení a schvalování změn oproti projektové dokumentaci stavby navržené Objednatelem a ověřené ve stavebním řízení, s odpovědnými projektanty a osobami pověřenými výkonem autorského dozoru;
- 2.2.14. průběžnou koordinaci postupu prací všech účastníků výstavby inženýrských objektů v rozsahu celkového členění stavby dle HMG a ZOV tak, aby byla zajištěna plynulost výstavby a aby nedošlo k poškození již realizovaných inženýrských objektů;
- 2.2.15. zajištění a provedení všech nezbytných průzkumů, rozborů, zkoušek, atestů a revizí podle ČSN předepsaných projektovou dokumentací, případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu, včetně pořízení protokolů zajištěných u akreditované zkušebny nebo potřebných pro řádné provedení a dokončení realizace zakázky,
- 2.2.16. pořízení fotodokumentace předmětu díla po ukončení realizace, přičemž každý snímek bude opatřen číslem, aktuálním datem.

2.3. K převímce stavby:

Zhotovitel předá Objednateli k převímacímu řízení dokončené stavby následující:

- 2.3.1. seznam všech předaných dokladů;
- 2.3.2. protokoly o provedení všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN, právních nebo technických předpisů vztahujících se k předmětu díla a platných v době

provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla;

2.3.3. projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby ve třech vyhotoveních v grafické podobě a jednom vyhotovení v elektronické podobě, při dodržení těchto požadavků Objednatele:

- a) do projektové dokumentace stavby ověřené ve stavebním řízení Zhotovitel zřetelně vyznačí všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla, a všechny změněné dokumenty označí nápisem „změna“ s odkazem na konkrétní změnový list, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou objednatele a její souhlasné stanovisko,
- b) ty části projektové dokumentace stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, Zhotovitel označí nápisem „beze změn“,
- c) každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby zhotovitel opatří jménem a příjmením osoby, která skutečnost potvrdila nebo která zakreslila změny, jejím podpisem a razítkem Zhotovitele,
- d) na každý výkres obsahující změnu oproti projektové dokumentaci stavby ověřené ve stavebním řízení Zhotovitel zajistí uvedení souhlasného stanoviska a podpisu odpovědného projektanta a pověřené osoby objednatele odpovědné za realizaci stavby,
- e) Zhotovitelem vyhotovena dokumentace bude zřetelně označena jako „dokumentace skutečného provedení stavby.“

Nedílnou součástí DSPS bude:

- a) protokoly o provedení všech nezbytných průzkumů, zkoušek, atestů a revizí podle ČSN, právních nebo technických předpisů vztahujících se k předmětu díla a platných v době provádění předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,
- b) celková situace včetně přívodů, přípojek, komunikací, podzemních i nadzemních vedení v areálu staveniště s údaji o hloubkách uložení sítí (i v digitální podobě),

2.3.4. doklady o uložení množství a kategorie odpadu na řízené skládky, případně doklad o předání a převzetí odpadu k recyklaci organizací (osobě) oprávněné k této činnosti;

2.3.5. geodetická zaměření (výškopisné a polohopisné) skutečného provedení samostatně pro každý stavební a inženýrský objekt zvlášť ve výkresové formě, textová data ve formátu *doc WORD a v digitální formě ve formátu * dgn programu MicroStation; výsledná data budou zobrazena v souřadnicovém systému S-JSTK x-y, výšky (z) Bpv ve 3. třídě přesnosti a budou ověřena oprávněným geodetem a dodána ve 3 originálních vyhotoveních pro každý inženýrský objekt zvlášť;

2.3.6. geometrický plán (dále jen „GP“) stavebních objektů zpevněných ploch a stavebního objektů.

2.3.7. doklady o vytýčení stavby dle souřadnic systému S-JTSK,

2.3.8. fotodokumentaci předmětu díla po ukončení realizace, přičemž každý snímek bude opatřen číslem a aktuálním datem;

2.3.9. kopie záručních listů dodaných výrobků, materiálů a zařízení v českém jazyce a jejich seznam s uvedením termínů platnosti záruky, potvrzení o zárukách jiných dodavatelů;

2.3.10. prohlášení o shodě na stavbě použitých materiálů, výrobků a realizovaných dodávek;

2.3.11. návody a manuály k provozu a údržbě dodávek včetně protokolů o zaškolení obsluhy

- jednotlivých technologických dodávek stavby se specifickými termíny kontrol;
- 2.3.12. písemné prohlášení zhotovitele, že dílo bylo zhotoveno v souladu s touto smlouvou, stavebním povolením a projektovou dokumentací pro provádění stavby;
- 2.3.13. originál stavebního deníku,
- 2.3.14. a ostatní doklady související s realizací díla, které nejsou výše výslovně uvedeny.
3. Zhotovením stavby smluvní strany rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních prací, montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např.: zařízení staveniště, provozní vlivy, dopravné, inženýrská činnost zhotovitele, zaškolení obsluhy, bezpečnostní opatření, přechodné dopravní značení, dokumentace skutečného provedení stavby apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby. Součástí zhotovení díla je mimo jiné i vypracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby a geodetické zaměření skutečného provedení dokončené stavby.
 4. Nedílnou součástí předmětu díla je i účast Zhotovitele na kolaudačním řízení a případném zkušebním provozu. Po vyhodnocení zkušebního provozu odstraní Zhotovitel případné provozní nedostatky a dílo bude uvedeno do trvalého provozu.
 5. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli dohodnutou cenu.
 6. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění podle této smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků.
 7. Smluvní strany se zavazují poskytnout si vzájemnou součinnost při kolaudaci zhotoveného díla.
 8. Realizace akce je výslovně podmíněna obdržáním příspěvku z 1. Výzvy MAS Jižní Haná – IROP-Bezpečná dopravní infrastruktura. Pokud bude akce z uvedeného titulu podpořena, bude nutné respektovat podmínky poskytnutí příspěvku stanovené 1. Výzvou MAS Jižní Haná.

IV.

Vlastnictví k dílu

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel.
2. Vlastníkem zařízení staveniště, včetně všech používaných strojů, mechanismů a dalších věcí potřebných k provedení díla, je Zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech bez ohledu na zavinění. Zhotovitel je odpovědný za svůj uskladněný a zabudovaný materiál, výrobky a zařízení.
3. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel od okamžiku převzetí staveniště do dne předání díla a jeho převzetí objednatel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle.

4. Veškeré podklady, které byly Objednatelům Zhotoviteli předány, zůstávají v jeho vlastnictví a Zhotovitel za ně zodpovídá od okamžiku jejich převzetí jako skladovatel a je povinen je vrátit Objednateli po splnění svého závazku.

V.

Místo plnění

Místem realizace díla je město Hulín, ul. Wolkerova, blíže viz. projektová dokumentace, (dále jen „staveniště“).

VI.

Termín plnění

1. Zhotovitel se zavazuje k řádnému provedení a předání díla ve lhůtě nejpozději do 40 kalendářních dnů od předání staveniště. Zhotovitel se zavazuje zahájit realizaci předmětu této smlouvy nejpozději do 14 dnů ode dne předání a převzetí staveniště. Staveniště bude předáno do 14 dnů na základě výzvy objednatele.
2. Zhotovitel je povinen zahájit a dokončit práce na díle v termínu sjednaném v této smlouvě dle časového harmonogramu postupu prací.
3. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud Zhotovitel nezačne provádění díla ve lhůtě 14-ti dnů ode dne předání staveniště.–Protokol o předání a převzetí staveniště podepsaný zodpovědnými pracovníky obou smluvních stran je nedílnou součástí stavebního deníku.
4. Zhotovitel je oprávněn dokončit dílo i před sjednaným termínem předání díla a Objednatel je povinen dříve dokončené dílo převzít.
5. Pokud v průběhu provádění díla:
 - a. dojde k nepředvídatelné změně rozsahu prací oproti projektové dokumentaci stavby nebo zhotovitel nebude schopen plynule pokračovat v provádění díla z důvodu neschopnosti dalšího financování díla objednatelem, lze termín dokončení díla dle odst. 1 tohoto článku přiměřeně změnit, a to pouze formou písemného dodatku k této smlouvě, uzavřeného smluvními stranami před uplynutím termínu uvedeného v odst. 1 tohoto článku. O změnu termínu zhotovitel požádá nejméně 3 pracovní dny před uplynutím termínu uvedeného v odst. 1 tohoto článku.
 - b. dojde k nepříznivým klimatickým podmínkám, za kterých nelze dodržet požadovanou kvalitu díla, případně dílo nelze provádět, zhotovitel přeruší na nezbytně nutnou dobu práce na díle. Toto přerušení zástupce zhotovitele запиše do stavebního deníku. O dobu přerušení prací z těchto důvodů se posouvá termín ukončení díla uvedený v odst. 1 tohoto článku. Tento zápis ve stavebním deníku, akceptovaný zástupcem objednatele, se stane závazným podkladem pro dodatečné uzavření dodatku k této smlouvě o dílo.

6. V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle. O dobu přerušení se prodlužují termíny tím dotčené.
7. Bude-li toto přerušení trvat déle než tři měsíce, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli již realizované práce v plné výši.
8. Před započítáním dalších prací vyhotoví smluvní strany zápis, ve kterém zhodnotí skutečný technický stav již provedených prací. Rozsah a cenu jejich nezbytných úprav před znovuzahájením realizace stavby sjednají smluvní strany dodatkem k této smlouvě o dílo.
9. Trvá-li přerušení prací na díle déle než dvanáct měsíců, z důvodů ležících na straně objednatele, závazek zaniká, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Smluvní strany provedou vyrovnání vzájemných pohledávek dohodou.
10. Objednatel si vyhrazuje možnost posunutí termínu zahájení s ohledem na své provozní a organizační potřeby a Zhotoviteli z takového posunu za žádných okolností nevyplyvá právo na účtování jakýchkoliv smluvních pokut, navýšení cen či náhrad škod. V případě posunutí termínu z důvodů na straně Objednatele se o stejný časový úsek prodlužuje termín pro dokončení.
11. V případě, že Zhotovitel bude s prováděním prací ve zřejmém prodlení, které by ohrožovalo plynulost realizace, nebo konečný termín dokončení, vyzve jej Objednatel k zintenzivnění prací a zápisem do stavebního deníku stanoví Zhotoviteli lhůtu k vyrovnání prodlení. Pokud ani poté Zhotovitel nepodnikne kroky k urychlení prací, je Objednatel oprávněn do doby vyrovnání prodlení s realizací pozastavit platby vystavených fakturačních dokladů.

VII. Cena díla

1. Cena za provedené dílo dle čl. III. této smlouvy o dílo je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení „**Rekonstrukce chodníku podél MK Wolkerova v Hulíně – úsek II. – 1.etapa**“ a činí:

Položka	Nabídková cena v Kč (bez DPH)	DPH 21 %	Nabídková cena v Kč (vč. DPH)
Celková nabídková cena dle oceněného rozpočtu	1.348.726,56	283.232,58	1.631.959,14

2. Cena sjednaná v čl. VII. odst. 1 této smlouvy je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná, pevná a konečná a platí po celou dobu realizace díla. Cena díla obsahuje všechny práce nutné k provoznímu využití a řádnému provedení stavby ve smluveném rozsahu, což Zhotovitel garantuje.

3. Cena podle čl. VII., odst. 1. této smlouvy je stanovena dle projektové dokumentace stavby a v rozsahu soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, předanými Objednatelům Zhotoviteli v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku. V ceně jsou dále zahrnuty náklady Zhotovitele nutné pro vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště, poplatky, jakož i jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla. Cena obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby ukončení díla.
4. Součástí této smlouvy je položkový rozpočet stavby vč. rekapitulace celkových nákladů stavby, zpracovaný Zhotovitelem v souladu se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, předanými Objednatelům Zhotoviteli v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku. Pokud položkový rozpočet, jenž tvoří Přílohu č. 1 této Smlouvy, neobsahuje některou z položek obsažených ve výkazech výměr, nemá tato skutečnost vliv na výši celkové ceny za dílo, uvedené v odst. 1 tohoto článku a Zhotovitel nemá právo, v důsledku neúplného ocenění výkazů výměr, domáhat se zvýšení sjednané ceny za provedení těchto prací.
5. Podkladem pro stanovení ceny díla jsou položkové rozpočty zpracované zhotovitelem a předložené v nabídce. Rozpočty jsou nedílnou součástí smlouvy o dílo. Ceny uvedené v těchto rozpočtech jsou pevné do data ukončení díla.
6. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, které jsou obsaženy, popsány nebo specifikovány v projektové dokumentaci (je jedno či v textové nebo výkresové části).
7. V případě, že z rozhodnutí Objednatelů dojde ke snížení smluveného rozsahu díla, dojde ke snížení ceny uvedené v čl. VII. odst. 1. této smlouvy. Náklady na méněpráce budou odečteny z ceny podle čl. VII. odst. 1. této smlouvy ve výši součtu rozdílu veškerých odpovídajících položek v položkovém rozpočtu stavby (Příloha č. 1). Ke snížení ceny díla dojde ve stejném stanoveném rozsahu rovněž v případě, že při vlastní realizaci díla bude použito menší množství materiálů, než je stanoveno v položkovém rozpočtu stavby, či nebudou provedeny práce, popř. budou provedeny v menším rozsahu, než jsou stanoveny v položkovém rozpočtu stavby. O této změně uzavřou smluvní strany dodatek k této smlouvě.
8. Cenu je možné zvýšit pouze v případě provedení dodatečných stavebních prací nad rámec množství nebo kvality uvedené v předané projektové dokumentaci stavby a v Příloze č. 1 této smlouvy, a to ve výši a za podmínek stanovených v zákoně č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Zvýšení ceny lze provést přičtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil provádět formou Změnového listu (dále jen „vícepráce“). Náklady na vícepráce budou připočteny k ceně podle čl. VII. odst. 1. této smlouvy. Náklady na vícepráce budou oceněny podle odpovídajících jednotkových cen položek dle položkového rozpočtu (Příloha č. 1). Oceňování víceprací, u kterých nelze využít jednotkových cen dle položkového rozpočtu (Příloha č. 1), bude provedeno podle cen ÚRS Praha platných v době uzavírání dodatku k této smlouvě.

Ke zvýšení ceny dojde pouze formou písemného dodatku k této smlouvě, podepsaného smluvními stranami před zahájením realizace víceprací. V případě, že zhotovitel provede vícepráce bez předchozího řádně uzavřeného písemného dodatku, nemá nárok na jejich úhradu.

9. Změnový list vystaví zhotovitel a uvede v něm původní dohodnuté plnění dle položkového rozpočtu, nově navržené plnění a výslednou změnu ceny.
10. Při změně rozsahu díla je Zhotovitel povinen připravit a vystavit změnový list, ve kterém mimo dalších náležitostí uvede původní dohodnuté plnění dle položkového rozpočtu, nově navržené plnění a výslednou změnu ceny.
11. Sjednaná cena může být také změněna v případě, že po podpisu této smlouvy a před termínem dokončení díla (zdanitelného plnění) dojde ke změnám sazeb DPH.
12. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými právními předpisy ke dni podpisu smlouvy a ke dni vystavení jednotlivých fakturačních dokladů.

VIII. Platební podmínky

1. Objednatel neposkytuje Zhotoviteli na provedení díla žádné zálohy.
2. Cena za dílo bude uhrazena jednorázově po dokončení díla na základě vystavené faktury.

Splatnost faktury je stanovena 30 dní ode dne doručení. Platba proběhne výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou uvedeny v této měně.

3. Faktury musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Kromě náležitostí, stanovených právními předpisy, musí faktura obsahovat i tyto údaje:
 - a) číslo smlouvy a datum jejího uzavření;
 - b) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí odkaz na číslo smlouvy);
 - c) obchodní firma, sídlo/místo podnikání, IČ a DIČ Zhotovitele;
 - d) název, sídlo IČ a DIČ Objednatele;
 - e) číslo a datum vystavení faktury;
 - f) lhůtu splatnosti faktury;
 - g) soupis provedených prací, vč. zjišťovacího protokolu;
 - h) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplacen;
 - i) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu.
 - j) celkovou sjednanou cenu bez DPH a celkovou výši DPH
 - k) **každá faktura musí být označena číslem projektu**
4. Nebude-li faktura obsahovat některou náležitost dle této smlouvy nebo bude-li chybně vyúčtována cena, je Objednatel oprávněn vadnou fakturu vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře (na titulní straně) vyznačí Objednatel důvod vrácení. Druhá smluvní strana provede opravu vystavením nové faktury. Vrátil-li objednatel vadnou fakturu druhé smluvní straně, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené (Zhotovitelem opravené) faktury.

IX.

Jakost díla

1. Zárukou za jakost díla přejímá zhotovitel díla závazek, že celkový souhrn vlastností provedeného díla uspokojí stanovené potřeby Objednatele, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, udržitelnost, hospodárnost a ochranu životního prostředí. Tyto vlastnosti budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým předpisům, uživatelským standardům a projektové dokumentaci stavby.

K tomu se Zhotovitel zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě.

2. Smluvní strany se dohodly na I. jakosti díla. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.
3. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu s platnými právními předpisy, podle schválených technologických postupů stanovených platnými českými technickými normami a bezpečnostními předpisy, v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupu pro tento typ realizace tak, aby dodržel smlouvenou kvalitu díla. Dodržení kvality všech prací a dodávek sjednaných v této smlouvě je závaznou povinností Zhotovitele. Zjištěné vady a nedodělky je povinen Zhotovitel odstranit na své náklady.

X.

Staveniště

1. Zápis o předání staveniště se stane dnem jeho podepsání nedílnou součástí stavebního deníku. Obvod staveniště je vymezen projektovou dokumentací. O předání a převzetí staveniště se sepiše zápis, který podepíší oprávněné osoby smluvních stran ve věcech stavby. Do zápisu o předání a převzetí staveniště se uvede minimálně identifikace dokladů ke stavbě, které objednatel předal zhotoviteli; výčet činností, které je zhotovitel povinen zajistit před zahájením prací; a termín prvního kontrolního dne. Tento zápis se stane dnem jeho podepsání nedílnou součástí stavebního deníku.
2. Zhotovitel zabezpečí na své náklady měření odběru vody a elektrické energie, případně dalších médií odebraných v průběhu stavby. Náklady na odběr těchto médií jsou součástí smluvní ceny dle této smlouvy a hradí je Zhotovitel.
3. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště a bezpečnosti silničního provozu v prostoru staveniště. Zhotovitel se zavazuje plnit povolené hygienické limity pro hluk ze stavební činnosti.
4. Zhotovitel je povinen staveniště zabezpečit proti vstupu a pohybu nepovolaných osob a na své náklady hlídání staveniště. Nositelem nebezpečí vzniku škody na stavebním materiálu nebo na celé stavbě při realizaci stavby je Zhotovitel, a to až do doby předání a převzetí celého díla Objednatelem.

5. Zhotovitel se zavazuje průběžně udržovat na staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností či dodávkou materiálů, výrobků, strojů a zařízení průběžně, vždy bez zbytečného odkladu poté, kdy tyto odpady a nečistoty vzniknou, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Zhotovitel je povinen rovněž provádět průběžné čištění příjezdných komunikací, pokud dojde k jejich znečištění provozem stavby.
6. Zhotovitel se zavazuje po ukončení stavebních prací provést závěrečný úklid a vyčištění staveniště, příjezdných komunikací a případných dalších ploch dotčených v souvislosti se stavbou, a to nejpozději do 5 dnů ode dne sepsání zápisu o předání díla. Při nedodržení tohoto závazku se Zhotovitel zavazuje uhradit objednateli mimo smluvní pokutu veškeré prokazatelné náklady a škody, které mu tím vznikly.

XI.

Provádění díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. V případě, že pověřil provedením jeho části jinou osobu, má Zhotovitel odpovědnost, jako by dílo provedl sám. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla pouze subdodavatele (dále také jako „poddodavatel“) uvedené v Seznamu předpokládaných subdodavatelů (Příloha č. 3 této smlouvy). Zhotovitel je oprávněn požádat objednatele o změnu v Seznamu předpokládaných subdodavatelů. V případě, že Zhotovitel o změnu v Seznamu předpokládaných subdodavatelů požádá, je právem Objednatele rozhodnout o tom, zda žádost o změnu v Seznamu předpokládaných subdodavatelů akceptuje nebo odmítne, přičemž odmítnutí nesmí být bezdůvodné. Akceptací Objednatele o změně Seznamu předpokládaných subdodavatelů se rozumí zápis ve stavebním deníku podepsaný zástupci obou smluvních stran.

Zhotovitel je oprávněn změnit subdodavatele, pomocí kterého prokázal část splnění kvalifikace, jen v nutných a závažných případech s předchozím písemným souhlasem Objednatele, přičemž nový subdodavatel, dosazený za původního, musí disponovat minimálně stejnými kvalifikačními předpoklady, které původní subdodavatel prokazoval za uchazeče v rámci výběrového řízení. Své kvalifikační předpoklady musí nově dosazený subdodavatel prokázat na vyzvání Objednatele a ten nesmí souhlas se změnou subdodavatele bezdůvodně odmítnout, pokud mu budou všechny předmětné dokumenty předloženy.

2. Zhotovitel se zavazuje provést soupis provedených prací za každý kalendářní měsíc provádění stavby, který doručí objednateli nejpozději do 5. dne následujícího kalendářního měsíce.
3. Zhotovitel je povinen se řídit rozhodnutími vydanými v průběhu povolování stavby a plnit všechny povinnosti z nich vyplývající.
4. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení dle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.
5. Zhotovitel vyzve Objednatele prokazatelně – zápisem ve stavebním deníku, nejméně 3

pracovní dny předem, k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při zhotovování díla zabudovány, zakryty nebo se stanou nepřístupné. Budou-li u těchto prací zjištěny nedostatky, budou zapsány do stavebního deníku, přičemž Zhotovitel je povinen před pokračováním prací prokázat Objednateli odstranění zjištěných nedostatků a zajistit si písemný souhlas Objednatele k pokračování prací. V případě, že se na tuto výzvu Zhotovitele Objednatel bez vážných důvodů nedostaví, může Zhotovitel pokračovat v provádění díla jen po předcházejícím písemném upozornění Objednatele. Toto upozornění však musí být Objednateli doručeno, jinak se má za to, že Objednatel vyzván nebyl. Pokud Zhotovitel nesplní tuto podmínku, vystavuje se nebezpečí provádění sond do zakrytých konstrukcí tak, jak určí pověřený zástupce Objednatele, a to na vlastní náklady Zhotovitele i v tom případě, že nebude shledáno pochybení v technologickém postupu. Neprovedení sond na žádost Objednatele se považuje za závažné porušení této smlouvy.

6. Zhotovitel se zavazuje do projektové dokumentace zaznamenávat všechny dohodnuté změny podle skutečného provedení stavby. Takto opravenou projektovou dokumentaci potvrzenou Zhotovitelem, odpovědným projektantem a Objednatелеm, předá Zhotovitel Objednateli ve čtyřech vyhotoveních v grafické podobě a jedno vyhotovení v elektronické při předání a převzetí dokončené stavby.
7. Zhotovitel je povinen písemně dokladovat Objednateli, jak bylo se vzniklým odpadem naloženo a na kterou skládku byl odpad uložen. Zhotovitel je povinen vést evidenci o vzniku a způsobu nakládání s odpady, která bude předložena stavebnímu úřadu před vydáním kolaudačního souhlasu. Při výkopových a stavebních pracích bude s odpady nakládáno tak, aby nedocházelo k promíchávání výkopových zemín se stavebním odpadem. Odpady budou odděleně tříděny podle druhů odpadů. Zhotovitel nese odpovědnost za zákonnou likvidaci veškerých odpadů, vzniklých v souvislosti s předmětnou stavbou.
8. Podle zákona číslo 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, je Zhotovitel povinen spolupůsobit při kontrolách hospodaření, prováděných u Objednatele orgánem finanční kontroly.
9. **Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2031.**
10. Zhotovitel je povinen zajistit řízení a odborné vedení stavby dle § 153 odst. 1 a 2 zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona, v platném znění odborně stavbyvedoucím a zástupcem stavbyvedoucího. Zhotovitel se rovněž zavazuje, že po celou dobu realizace díla bude vykonávat funkci stavbyvedoucího a jeho zástupce osoba uvedená v článku I. této Smlouvy, jejíž kvalifikaci prokazoval v rámci zadávacího řízení. Změnu v osobě jakéhokoliv člena realizačního týmu, jímž byla prokazována kvalifikace Zhotovitele v průběhu výběrového řízení je Zhotovitel po podpisu této Smlouvy povinen písemně oznámit Objednateli, přičemž nový člen realizačního týmu musí splňovat požadavky Objednatele na daného člena realizačního týmu, jak byly stanoveny v Zadávacích podmínkách na předmětnou veřejnou zakázku.
11. Objednatel je při realizaci předmětu plnění této zakázky povinen zajistit při provádění díla výkon činnosti Koordinátora ochrany bezpečnosti a zdraví při práci (dále jen „K-BOZP“) kvalifikovanou osobou, v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další

požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. Objednatel i Zhotovitel jsou povinni při realizaci předmětné zakázky (stavby) vytvářet koordinátorovi, případně koordinátorům podmínky pro výkon jeho funkce. Jakékoliv sankce a pokuty, které by byly proti Objednateli uplatněny z titulu nerespektování pokynů, stanovisek a požadavků K-BOZP Zhotovitelem, je Objednatel oprávněn uplatnit a započíst vůči jakýmkoliv závazkům vůči Zhotoviteli jako náhradu škody, čímž se rovněž rozumí odškodnění v plné výši.

12. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnost práce na staveništi dle zákona č. 309/2006 sb. a respektovat pokyny koordinátora BOZP.
13. Veškeré odborné práce musí vykonávat zaměstnanci Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci a odbornost. Zástupce Objednatele je oprávněn požadovat doložení dokladů o této kvalifikaci. Zhotovitel se rovněž zavazuje, aby po celou dobu realizace díla vykonávala funkci hlavního stavbyvedoucího osoba, jejíž kvalifikaci prokazoval v rámci zadávacího řízení „**Rekonstrukce chodníku podél MK Wolkerova v Hulíně – úsek II. – 1. etapa**“. Změnu v osobě stavbyvedoucího po podpisu této smlouvy je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli, přičemž nový stavbyvedoucí musí splňovat požadavek objednavatele na stavbyvedoucího, jak byly stanoveny v zadávacích podmínkách na předmětnou veřejnou zakázku.
14. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel Kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však jedenkrát týdně. Obsahem Kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a koordinátora BOZP, a stanovení případných nápravných opatření, úkolů a stanovení termínu dalšího kontrolního dne.
Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci Objednatele včetně osob vykonávajících funkci Technického dozoru investora, Autorského dozoru, Koordinátora BOZP a zástupci Zhotovitele.
Objednatel pořizuje z Kontrolního dne zápis o jednání, který elektronicky předá všem osobám, které se mají kontrolních dnů zúčastňovat.
Zhotovitel zapisuje datum konání Kontrolního dne do stavebního deníku a zápisy z Kontrolních dní jsou nedílnou součástí stavebního deníku.
15. Zhotovitel je povinen umožnit osobám pověřeným Objednatelem vstup do místa realizace díla po předchozím upozornění ze strany Objednatele nebo jeho zástupce.
16. Zhotovitel je povinen nechat si odsouhlasit Objednatelem obvod staveniště a velikost a délku záboru na dotčených pozemcích.
17. Zhotovitel je povinen doložit platné atesty či certifikáty, případně další dokumenty

prokazující splnění požadovaných technických a kvalitativních parametrů používaných výrobků a materiálů, a to s dostatečným časovým předstihem při odsouhlasování užitých materiálů. Bez doložení těchto atestů není zhotovitel oprávněn započít s osazováním příslušných výrobků do stavby. Veškeré dokumenty musí zhotovitel předkládat v českém jazyce.

18. Zhotovitel organizačně zajistí nejpozději do 3 pracovních dní od podpisu Smlouvy společné koordinační jednání zástupce Objednatele, zástupce Zhotovitele, projektanta, technického dozoru investora, koordinátora BOZP a provozovatele zařízení. Na tomto jednání předloží Zhotovitel časový harmonogram a zpracované zásady organizace výstavby k vyjádření dotčených subjektů. Na tomto jednání budou dotčené subjekty seznámeny s formou identifikace zástupců Zhotovitele na stavbě. Na tomto jednání bude smluvními stranami dohodnuto, kde vznikne staveniště a kde budou umístěny prostory k užívání Objednatele, včetně plánu na omezení provozu těchto prostor, které budou určeny Objednatel s tím, že Zhotovitel s ohledem na plán organizace výstavby zapracuje požadavky Objednatele.
19. Objednatel požaduje jednotnou, jednoznačnou a viditelnou identifikaci všech pracovníků na staveništi. Požadavek na jednotnou identifikaci pracovníků se vztahuje na všechny pracovníky po celou dobu stavby, tedy i na pracovníky subdodavatelů.
20. Zhotovitel musí během realizace díla plně a bezvýhradně respektovat a dodržovat „Požadavky Objednatele na pravidla realizace předmětu zakázky“ uvedené v příloze č. 4 této Smlouvy.
21. Zhotovitel má povinnost dát Objednateli k odsouhlasení dodávané technologie a výrobky a před jejich samotnou instalací konzultovat se zástupci Objednatele. Objednatel má možnost odmítnout dodávané produkty, za předpokladu jejich nesouladu se zadávacími podmínkami či nabídkou Zhotovitele předloženou v rámci výběrového řízení.
22. Objednatel si vyhrazuje právo požadovat po Zhotoviteli změnu dodávaných produktů a materiálu, a rovněž snížení objemu prací. K požadavku Objednatele uvedenému v tomto článku se musí Zhotovitel vyjádřit a poskytnout Objednateli součinnost při změně rozsahu díla nebo změně jeho kvalitativní stránky. Veškeré takto dohodnuté změny mohou být realizované až po uzavření dodatku ke smlouvě, do kterého budou tyto změny zaneseny.
23. Objednatel informuje Zhotovitele a Zhotovitel bere na vědomí, že realizace díla bude probíhat bez omezení pohybu chodců a Zhotovitel zajistí vždy v úseku, kde budou stavební práce probíhat bezpečné podmínky pro pohyb chodců.

XII.

Stavební deník

1. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník, jehož nedílnou součástí bude zápis o předání a převzetí staveniště.

2. Do stavebního deníku Zhotovitel запиše všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy, zejména údaje popisu a množství provedených prací a montáží, údaje o časovém postupu dodávek, prací a jejich jakosti, důvody přerušení prací a dobu přerušení, a údaje potřebné pro posouzení prací orgány státní správy a Objednatelem. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla nebo jeho části, případně odstraněním poslední vady či nedodělku nacházejících se v protokolu o předání a převzetí díla.
3. Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny bez omezení stavební deník kontrolovat a k zápisům připojovat svá stanoviska. Zhotovitel má povinnost kontrolovat stavební deník pravidelně každý pracovní den Zhotovitele.
4. Stavební deník, jenž bude v průběhu pracovní doby k dispozici na stavbě v kanceláři hlavního stavbyvedoucího nebo stavbyvedoucího Zhotovitele, musí obsahovat:
 - základní list, v němž se uvádí název a sídlo Objednatele, projektanta a změny těchto údajů,
 - identifikační údaje stavby podle realizační projektové dokumentace,
 - seznam předpokládaných subdodavatelů dle nabídky Zhotovitele na zakázku,
 - přehled smluv, včetně jejich dodatků a změn,
 - seznam dokladů a rozhodnutí, týkajících se stavby,
 - seznam dokumentace stavby, jejich změn a doplnění,
 - zápis o předání a převzetí staveniště.
5. Denní záznamy budou zapisovány do deníku s očíslovanými listy, jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy budou očíslovány shodně s listy pevnými. Zhotovitel bude Objednateli předávat v místě stavby první průpis denních záznamů.
6. Denní záznamy bude čitelně zapisovat a podepisovat hlavní stavbyvedoucí (jeho zástupce) v den, kdy práce byly provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které vyvolaly nutnost zápisu (např. provádění prací na stavbě jiným subdodavatelem, než je uvedený v Seznamu předpokládaných subdodavatelů dle nabídky Zhotovitele na zakázku). Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa.
7. Do stavebního deníku je oprávněn provádět záznamy kromě osoby Objednatele odpovědné za realizaci stavby také zástupce státního stavebního dohledu a odpovědný projektant.
8. Nesouhlasí-li hlavní stavbyvedoucí se záznamem orgánů a osob uvedených v předchozím ustanovení, připojí k jejich záznamu do 2 pracovních dnů své vyjádření. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem záznamu souhlasí.
9. Nesouhlasí-li Objednatel či technický dozor investora s obsahem záznamu ve stavebním deníku, vyznačí námitky svým zápisem do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen přerušit práce a činnosti v rozsahu výše uvedených námitek do doby, než budou tyto námitky Objednatele zhotovitelem odstraněny.
10. Záznamy ve stavebním deníku nelze měnit obsah této smlouvy, k její změně může dojít pouze uzavřením dodatku ke smlouvě o dílo.

XIII.

Předání díla

1. Po dokončení díla je Zhotovitel povinen vyzvat Objednatele k převzetí díla, a to zápisem ve stavebním deníku, s předpokládaným termínem předání díla, který musí být stanoven minimálně 3 pracovní dny po tomto zápisu ve stavebním deníku.
2. O předání díla bude sepsán zápis. Tento zápis sepiše Zhotovitel a bude obsahovat:
 - označení díla,
 - označení Objednatele a Zhotovitele díla,
 - číslo a datum uzavření smlouvy o dílo vč. čísel a dat uzavření jejich dodatků, včetně celkové ceny díla včetně dodatků,
 - zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,
 - soupis případných vad a nedodělků nebránících řádnému užívání díla a termín jejich odstranění,
 - prohlášení Objednatele, že dílo přejímá,
 - datum a místo sepsání zápisu,
 - jména a podpisy zástupců Objednatele a Zhotovitele,
 - seznam předané dokumentace,
 - soupis nákladů od zahájení po dokončení díla,
 - termín vyklizení staveniště,
 - datum ukončení záruky na dílo (po odstranění všech případných vad a nedodělků).
3. V rámci předání díla předá Zhotovitel Objednateli doklady a listiny specifikované v čl. III. odst. 2.3. této smlouvy. Bez těchto dokladů se stavba považuje za nepředané dílo.
4. Objednatel má právo odmítnout dílo převzít, nebude-li dokončené, což uvede v zápise. Zhotovitel je povinen dílo dokončit a poté opětovně Objednatele vyzvat k převzetí díla.
4. Po odstranění všech vad a nedodělků uvedených v zápise o předání díla bude stranami sepsán zápis o tom, že Objednatel dílo převzal bez vad a nedodělků kromě drobných vad dle § 2628 občanského zákoníku.
6. Dílo se považuje za řádně splněné až předáním Objednateli bez vad a nedodělků vč. dokladů pro kolaudaci díla, kromě drobných vad dle § 2628 občanského zákoníku. Objednatel má právo v zápise o předání díla výslovně uvést, že je dílo řádně splněno i v případě existence drobných vad a nedodělků. V případě, že se při odevzdání díla projeví vady, které nebrání v užívání díla a neohrožují život a zdraví lidí, Objednatel dílo může převzít s tím, že v „Zápise o odevzdání a převzetí díla“ budou stanoveny termíny odstranění těchto vad.
7. Zhotovitel je povinen nejpozději do 60 dnů ode dne podepsání Zápisu o předání a převzetí díla předat (doručit) objednateli seznam poddodavatelů (vč. podpisu zhotovitele)

XIV.

Záruční podmínky a odpovědnost za vady

1. Zhotovitel odpovídá za úplnost a funkčnost předmětu díla, za jeho kvalitu, která bude odpovídat realizační projektové dokumentaci, platným normám ČSN, vztahujícím se k danému předmětu plnění, standardům a podmínkám výrobců a dodavatelů materiálů a výrobků, specifikovaných výhradně v realizační projektové dokumentaci, platných v ČR v době realizace díla.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání, a za vady díla v záruční době. Za vady, které se projeví po záruční době stavby, odpovídá Zhotovitel jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo porušení jeho povinností. Odpovědnost za vady se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.
3. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost stavební části díla 60 měsíců. Na dodávky technologického charakteru se samostatným záručním listem platí záruka poskytnutá výrobcem, min. však v délce 24 měsíců.
4. Záruční doba začíná plynout ode dne protokolárního předání a převzetí díla bez vad a nedodělků dle čl. XIII. odst. 6.
5. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, Objednatel písemně oznámí Zhotoviteli její výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile Objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady.
6. V případě, že Objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady, zahájí Zhotovitel práce na odstranění vad nebránící užívání díla do 72 hodin v pracovní dny od oznámení vad a vadu odstraní do 5 pracovních dnů od nastoupení (je-li to technologicky možné nebo nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak).

V případě havarijní vady (tj. vady bránící užívání díla) zahájí Zhotovitel práce na odstranění vady ihned (nejpozději do 12 hodin) po oznámení havarijní vady a práce provede ve lhůtě stanovené písemnou dohodou obou smluvních stran.

Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ani během dvojnásobku dob uvedených v odstavci 6 tohoto článku, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady včetně havárie třetí osobu. Veškeré takto vzniklé náklady Objednatele uhradí Zhotovitel, práva Objednatele ze záruky nejsou dotčena. Právo Objednatele vůči Zhotoviteli na uplatnění náhrady škody není dotčeno.
7. Objednatel je povinen umožnit Zhotoviteli odstranění vady v rozsahu nezbytně nutném pro odstranění reklamované vady.
8. O odstranění vady musí být sepsán zápis s tím, že Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli na provedenou opravu záruku ve stejné délce jako na celé dílo. Záruční doba běží od podepsání zápisu o odstranění vady oběma smluvními stranami. Zhotovitel je povinen vést řádnou evidenci reklamovaných vad po dobu záruční doby, ke které bude Objednatel potvrzovat odstranění vad (1x evidence pro Objednatele).

XV.

Odpovědnost za škodu

1. Odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle nebo jeho části nese Zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků kromě drobných vad dle § 2628 občanského zákoníku.
2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.
3. Pokud činností Zhotovitele, osob použitých při provádění díla nebo činností jeho subdodavatelů dojde ke způsobení škody Objednateli, třetím osobám nebo na životním prostředí z titulu prokázaného opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících z právních předpisů, technických norem nebo z této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu takto vzniklou škodu odstranit a není-li to možné, tak poškozenému finančně nahradit způsobenou škodu či uhradit pokutu vyměřenou příslušným správním orgánem.
3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejich zmírnění. V případě přerušení realizace stavby provede Zhotovitel veškerá opatření potřebná k odvrácení škody za úhradu prokazatelných nákladů.
4. Smluvní strany se dohodly na vyloučení použití ustanovení § 2630 odst. 2 občanského zákoníku a sjednávají, že zhotovitel se nemůže zprostit povinnosti z vady díla způsobené chybou ve stavební dokumentaci nebo selháním dozoru nad stavbou.

XVI.

Sankční ujednání

1. V případě prodlení Zhotovitele se splněním díla bude Objednatel účtovat smluvní pokutu ve výši 0,1 % ze smlouvené ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení.
2. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je Zhotovitel oprávněn vyúčtovat Objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý kalendářní den prodlení.
3. V případě prodlení Zhotovitele s vyklizením a vyčištěním staveniště, bude objednatel účtovat smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.
4. V případě prodlení Zhotovitele se splněním termínu k odstranění vady, která se projevila v záruční době, bude Objednatel účtovat smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení a za každou vadu.
5. V případě prodlení Zhotovitele se splněním termínu k odstranění vad a nedodělků sepsaných v zápise o předání stavby má Objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 0,02% z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení a za každou vadu či nedodělek.

6. V případě změny subdodavatele oproti Seznamu předpokládaných subdodavatelů dle nabídky Zhotovitele na zakázku (Příloha č. 3 této smlouvy) provedených bez souhlasu Objednatele bude objednatel účtovat smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti.
7. V případě, že Zhotovitel nesplní kteroukoliv z povinností či poruší jakoukoli povinnost vyplývající mu z této smlouvy o dílo, vyjma povinností uvedených v odst. 1, 3 až 6 tohoto článku, bude Objednatel vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000,-Kč za každý jednotlivý zjištěný případ porušení povinností.
8. Jestli-že při prováděných kontrolách najde jakýkoliv dotčený kontrolní orgán pochybení ve fakturaci Zhotovitele, které bude spočívat ve fakturaci neoprávněných prací, dodávek či služeb, tj. prací, dodávek a služeb, které nebyly realizovány v objemu, ve kterém byla provedena fakturace, bude Objednatel uplatňovat vůči Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 50% z hodnoty vzniklé neoprávněné fakturace.
9. V případě, že závazek provést dílo zanikne řádným ukončením díla nebo odstoupením od smlouvy, nezaniká Objednateli nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinností Zhotovitelem.
10. Zánik závazku pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.
11. Vedle smluvní pokuty má Objednatel nárok na náhradu vzniklé škody, a to i nad rámec sjednané výše smluvní pokuty.
12. Smluvní pokuty je Objednatel oprávněn započíst proti pohledávce Zhotovitele a naopak.
13. V případě prodlení Objednatele s úhradou úplné faktury náleží Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý dne prodlení.
14. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 21 dnů od doručení výzvy k zaplacení.

XVII.

Vyšší moc

1. Pro účely smlouvy se za okolnosti vyšší moci, které mohou mít vliv na sjednaný termín dokončení stavby, považují mimořádné, objektivně neodvratitelné okolnosti, znemožňující splnění povinností dle této smlouvy, které nastaly po uzavření této smlouvy a nemohou být Zhotovitelem odvráceny jako např. živelné pohromy, stávky, válka, mobilizace, povstání nebo jiné nepředvídané a neodvratitelné události. Za okolnosti vyšší moci jsou dle této Smlouvy považovány i nepříznivé klimatické podmínky, za kterých nebude objektivně technicky či technologicky možná realizace díla. S ohledem na toto ustanovení má Zhotovitel právo požádat Objednatele o přerušení díla z důvodu klimatických podmínek, a to například i na celé zimní období. Zadavatel jeho požadavku na přerušení na delší období může a nemusí vyhovět. Zhotovitel každou žádost musí objektivně odůvodnit a přerušení

z důvodu klimatických podmínek musí vždy dokladovat ve stavebním deníku nebo v zápisech z kontrolních dnů. O dobu přerušení se prodlužují termíny tím dotčené.

2. Smluvní strana, u níž dojde k okolnosti vyšší moci, a bude se chtít na vyšší moc odvolat v souvislosti s plněním této smlouvy, je povinna neprodleně písemně doporučeným dopisem uvědomit druhou smluvní stranu o vzniku této události, jakož i o jejím ukončení, a to ve lhůtě nejpozději 7 kalendářních dnů od vzniku a 7 kalendářních dnů od jejího ukončení. Nedodržení této lhůty má za následek zánik práva dovolávat se okolnosti vyšší moci.
3. Povinnosti smluvních stran dané touto smlouvou o dílo se po dobu trvání okolnosti vyšší moci dočasně přerušují.
4. Pokud se plnění této smlouvy o dílo stane nemožné vlivem zásahu vyšší moci, smluvní strany se dohodnou na odpovídající změně této smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění díla dodatkem k této smlouvě. Nedojde-li k dohodě, je kterákoliv smluvní strana oprávněna jednostranným prohlášením zaslaným doporučeným dopisem druhé smluvní straně odstoupit od této smlouvy.

XVIII.

Ostatní ujednání

1. Objednatel může od smlouvy odstoupit v případě následujících podstatných porušení smlouvy, tj.:
 - Zhotovitel je v prodlení s plněním díla dle termínu v čl. VI odst. 1 této smlouvy, pokud se Zhotovitel nedohodne s Objednatelem na prodloužení termínu,
 - Zhotovitel při realizaci díla nerespektuje podmínky vyplývající z projektové dokumentace a stavebního povolení,
 - Zhotovitel při realizaci díla nerespektuje opakovaně bezdůvodně připomínky autorského dozoru, technického dozoru investora a koordinátora BOZP,
 - Zhotovitel provádí práce na díle v rozporu s touto smlouvou o dílo či nekvalitně a nesjedná nápravu ani v přiměřené době poté, co byl na tuto skutečnost opakovaně upozorněn zápisem Objednatele ve stavebním deníku,
 - Zhotovitel přestal plnit kvalifikaci požadovanou objednatel, mj. i tím, že nezajistil realizaci dané části díla konkrétním subdodavatelem, s jehož pomocí prokazoval část své kvalifikace v zadávacím řízení uvedením v čl. II odst. 3 písm. c) této smlouvy,
 - Zhotovitel neprokáže platné a účinné pojištění zhotovitele dle článku II odst. 5 této smlouvy po celou dobu trvání této smlouvy.
2. Objednatel i Zhotovitel mají právo odstoupit od smlouvy, změní-li se po uzavření smlouvy její základní účel, v důsledku podstatné změny okolností, za nichž byla smlouva uzavřena nebo v případě zásahu vyšší moci.
3. Odstoupením smlouva o dílo zaniká dnem, kdy bude oznámení o odstoupení doručeno druhé smluvní straně. V případě odstoupení je Zhotovitel povinen ihned po obdržení písemného oznámení o odstoupení od smlouvy předat Objednateli nedokončené dílo, včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla, a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit Zhotoviteli cenu díla včetně věcí, které převzal.

4. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou obou smluvních stran.
5. Zhotovitel nemůže bez předchozího písemného souhlasu Objednatele postoupit své pohledávky, práva či nároky plynoucí ze smlouvy na třetí osobu.
6. Obě smluvní strany se dohodly, že v případě nástupnictví jsou nástupci smluvních stran vázány ustanoveními této smlouvy v plném rozsahu.
7. V případě zániku závazku před splněním díla uzavřou smluvní strany dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.
8. Zhotovitel se zavazuje v rozsahu znění této smlouvy respektovat dohody uzavřené Objednatelem s odpovědným projektantem, jako osobou pověřenou výkonem autorského dozoru, pokud nejsou v rozporu s ustanovením této smlouvy, a dále s technickým dozorem investora a koordinátorem BOZP.
9. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran před zahájením plnění. To neplatí pro údaje obsažené v čl. I. této smlouvy, u kterých při jejich změně postačí oznámení způsobem upraveným v čl. II. odst. 3 této smlouvy. Písemná forma musí být zachována rovněž v případě odstoupení od smlouvy. Smluvní strany odchýlně od ustanovení § 582 odst. 2 sjednávají, že mohou namítnout neplatnost změny této smlouvy pro nedodržení sjednané formy i v případě, že již bylo plněno. Smluvní strany se dále odchýlně od ustanovení občanského zákoníku, která obecně upravují uzavření smlouvy, dohodly, že dodatek je uzavřen výlučně tehdy, byl-li písemný návrh dodatku podepsán a předložený jednou smluvní stranou podepsán druhou smluvní stranou ve znění předloženého návrhu bez jakýchkoli změn, výhrad apod. a doručen navrhující smluvní straně. Za přijetí návrhu dodatku se nebude považovat případ, kdy smluvní strana, které byl návrh adresován, se fakticky zachová podle návrhu dodatku, tj. např. poskytne-li nebo přijme-li plnění, aniž by zároveň návrh dodatku podepsala.
10. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým. Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.
11. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze smluvních stran její doručení odmítne či jinak znemožní.
12. Smluvní strany se zavazují zachovávat po celou dobu trvání této smlouvy a i po předání a převzetí díla v tajnosti informace a podklady, které budou při jejich sdělení označeny jako důvěrné nebo na jejichž utajení oprávněná strana trvá. Za důvěrné jsou smluvními stranami označeny veškeré informace, které jsou jako takové výslovně označeny jako „Důvěrné“ anebo jsou takového charakteru, že jejich zveřejnění může přivodit účastníkovi této smlouvy újmu, bez ohledu na to, zda mají povahu osobních, obchodních či jiných informací. Za důvěrné se nepovažují jediné takové informace, které jsou veřejně přístupné nebo byly

druhou smluvní stranou uveřejněny. Takových informací nebo podkladů nemůže být využito druhou smluvní stranu k jinému účelu. Dojde-li porušením těchto povinností ke škodě, je smluvní strana, která se porušení dopustila, povinna druhé smluvní straně vzniklou škodu nahradit. Toto se nevztahuje na informace, které je objednatel povinen poskytnout dle platných právních předpisů.

13. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 let od zániku této smlouvy. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této Smlouvy.
14. **Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2031 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům 98 Vydání 1.10 Obecná pravidla pro žadatele a příjemce Platnost od 27. 10. 2017 pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.**
15. Zhotovitel je povinen poskytnout součinnost při výkonu finanční kontroly dle zákona o finanční kontrole.
16. Smluvní strany se dohodly na vyloučení použití ustanovení § 1987 odst. 2 občanského zákoníku a sjednávají, že i nejistá nebo neurčitá pohledávka je způsobilá k započtení
17. Objednatel současně informuje Zhotovitele a Zhotovitel bere na vědomí, že technický dozor investora nesmí u této zakázky provádět Zhotovitel ani osoba s ním propojená.

XIX.

Závěrečná ujednání

1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
2. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž Objednatel obdrží dvě a Zhotovitel dvě vyhotovení.
3. Objednatel v případě neobdržení příspěvku od MAS Jižní Haná-IROP-Bezpečná dopravní infrastruktura na realizaci akce v daném roce (2018) si rovněž vyhrazuje právo realizaci akce odložit, zrušit či realizovat v omezeném rozsahu.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva bude uvedena v evidenci smluv vedené Objednatelem. Evidence smluv je veřejně přístupná a obsahuje zejména údaje:
 - o smluvních stranách
 - o předmětu smlouvy

- konec platnosti smlouvy.

Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené ve smlouvě nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

5. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet stavby vč. rekapitulace celkových nákladů stavby

Příloha č. 2 - Časový harmonogram postupu prací

Příloha č. 3 - Seznam předpokládaných poddodavatelů

Příloha č. 4 - Požadavky objednatele na pravidla realizace předmětu zakázky

Příloha č. 5 – Pojistná smlouva

6. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, a že byla uzavřena po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a její autentičnost stvrzují svými podpisy.
7. Uzavření této smlouvy o dílo bylo schváleno Objednatelem městem Hulín dne 06.01.2021 usnesením rady města č. 2/49/RM/2021, a to na základě řádně vyhlášeného a vyhodnoceného zadávacího řízení.
8. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svých oprávnění k zastoupení.

V Hulíně, dne: 12.01.2020

V Kroměříži, dne: 11.01.2021

za Objednatele:

za Zhotovitele:

MĚSTO HULÍN

768 24 Hulín, nám. Míru 162

IČ: 00287229, DIČ: CZ00287229

Správa a údržba silnic Kroměřížska, s.r.o.

Kotojedy 56

767 01 KROMĚŘÍŽ

IČO 26908298, DIČ CZ26908298

-11-

Mgr. Roman Hoza
starosta města

Ing. Emil Vraník
jednatel společnosti

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2020-08-28
Stavba: Wolkerova

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 23. 4. 2020
Zadavatel: IČ:
DIČ:
Uchazeč: IČ: 26908298
Správa a údržba silnic Kroměřížska s.r.o., Kotojedy 56, Kroměříž 76701 DIČ: CZ26908298
Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:
Poznámka:

Cena bez DPH			1 348 726,56
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	1 348 726,56	283 232,58
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			1 631 959,14

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

MĚSTO HULÍN
768 24 Hulín, nám. Míru 162
IČ: 00287229, DIČ: CZ00287229

Správa a údržba silnic Kroměřížska, s.r.o.
Kotojedy 56
767 01 KROMĚŘÍŽ -11-

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2020-08-28

Stavba: Wolkerova

Místo: Datum: 23. 4. 2020

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Správa a údržba silnic Kroměřížska s.r.o., Kotojedy 56, Krom Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		1 348 726,56	1 631 959,14
170A15	Rekonstrukce chodníku podél MK Wolkerova v Hulíně (úsek II. KM 0,000-0,307)	1 348 726,56	1 631 959,14
Způsobilé	Způsobilé výdaje projektu	1 116 834,68	1 351 369,96
Hlavní	Hlavní aktivity projektu	1 082 444,68	1 309 758,06
SO102	Chodník - Úsek II KM 0,000-0,307	1 082 444,68	1 309 758,06
Vedlejší	Vedlejší aktivity projektu	34 390,00	41 611,90
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	34 390,00	41 611,90
Nezpůsobilé	Nezpůsobilé výdaje projektu	231 891,88	280 589,17
é	Chodník - Úsek II KM 0,000-0,307 NEUZNATELNE NÁKLADY	218 416,88	264 284,42
SO102.1	NÁKLADY	218 416,88	264 284,42
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	13 475,00	16 304,75

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Wolkerova

Objekt:

170A15 - Rekonstrukce chodníku podél MK Wolkerova v Hulíně (úsek II. KM 0,000-0,307)

Soupis:

Způsobilé - Způsobilé výdaje projektu

Uroveň 4:

SO102 - Chodník - Úsek II KM 0,000-0,307

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

23. 4. 2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Správa a údržba silnic Kroměřížska s.r.o., Kotojedy 56, Kroměříž 76701

IČ:

DIČ:

26908298

CZ26908298

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 082 444,68

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 082 444,68	21,00%	227 313,38
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 309 758,06

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

MĚSTO HULÍN

768 24 Hulín, nám. Míru 162

IČ: 00287229, DIČ: CZ00287229

Správa a údržba silnic Kroměřížska, s.r.o.

Kotojedy 56

767 01 KROMĚŘÍŽ

IČO 26908298, DIČ CZ26908298

-11-

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Wolkerova

Objekt:

17OA15 - Rekonstrukce chodníku podél MK Wolkerova v Hulině (úsek II. KM 0,000-0,307)

Soupis:

Způsobilé - Způsobilé vydaje projektu

Uroveň 4:

SO102 - Chodník - Úsek II KM 0,000-0,307

Místo:

Datum:

23. 4. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Správa a údržba silnic Kroměřížska s.r.o., Kotojedy 56, Kroměříž 767 Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 082 444,68

HSV - Práce a dodávky HSV

1 056 882,47

1 - Zemní práce

202 259,64

5 - Komunikace pozemní

428 584,90

8 - Trubní vedení

26 150,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

154 886,50

997 - Přesun sutě

147 094,23

998 - Přesun hmot

97 907,20

PSV - Práce a dodávky PSV

25 562,21

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

25 562,21

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Wolkerova
 Objekt: 170A15 - Rekonstrukce chodníku podél MK Wolkerova v Hulíně (úsek II. KM 0,000-0,307)
 Soupis: Způsobilé - Způsobilé výdaje projektu
 Úroveň 4: SO102 - Chodník - Úsek II KM 0,000-0,307

Místo: Datum: 23. 4. 2020

Zadavatel: Projektant:
 Uchazeč: Správa a údržba silnic Kroměřížska s.r.o., Kotojedy 56, Kroměříž 767 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 1 082 444,68

D HSV Práce a dodávky HSV 1 056 882,47

D	1		Zemní práce				202 259,64	
1	K	111301111	Sejmutí drnu tl. do 100 mm, v jakékoliv ploše	m2	59,000	77,50	4 572,50	CS ÚRS 2020 01
	WV		viz C.2.2					
	WV		59		59,000			
	WV		Součet		59,000			
2	K	113106121	Rozebrání diazeo a dílců komunikací pro pesi, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek komunikací pro pěši s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek	m2	533,000	20,00	10 660,00	CS ÚRS 2020 01
	WV		viz C.2.2					
	WV		209*2		418,000			
	WV		87*2		174,000			
	WV		-59		-59,000			
	WV		Součet		533,000			
3	K	113107222	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	622,000	28,60	17 789,20	CS ÚRS 2020 01
	WV		viz C.2.2					
	WV		214*2		428,000			
	WV		87*2		174,000			
	WV		10*2		20,000			
	WV		Součet		622,000			
4	K	113107242	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 živičných o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	20,000	105,50	2 110,00	CS ÚRS 2020 01
	WV		viz C.2.2					
	WV		10*2		20,000			
	WV		Součet		20,000			
6	K	113202111	Výtrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků	m	311,000	42,00	13 062,00	CS ÚRS 2020 01
	WV		stříelných					
	WV		viz C.2.2					
	WV		224+87		311,000			
	WV		Součet		311,000			
7	K	120001101	Příplatek k cenám vykopávek za ztlžení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy	m3	93,300	512,00	47 769,60	CS ÚRS 2020 01
8	K	122252204	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I přes 100 do 500 m3	m3	93,300	122,50	11 429,25	CS ÚRS 2020 01
	WV		viz C.2.2 a C.4					
	WV		224*2*0,15		67,200			
	WV		87*2*0,15		26,100			
	WV		Součet		93,300			
9	K	162751117	Vodorovné přemístění vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení vykopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	93,300	254,50	23 744,85	CS ÚRS 2020 01
10	K	162751119	Vodorovné přemístění vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení vykopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 z1	m3	746,400	20,80	15 525,12	CS ÚRS 2020 01
	WV		93,3*8 "Přepočtené koeficientem množství		746,400			
	WV		Součet		746,400			
11	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	93,300	16,50	1 539,45	CS ÚRS 2020 01
12	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kameni zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	186,600	155,00	28 923,00	CS ÚRS 2020 01
	WV		z1					
	WV		93,3*2 "Přepočtené koeficientem množství		186,600			
	WV		Součet		186,600			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhuťněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopačkách viz C.2.1 a C.4 (2+24,5+2,25+2,25+97+91,5+15)*0,04 Součet	m3	9,380 9,380 9,380	122,50	1 149,05	CS ÚRS 2020 01
14	M	58337344	šterkopisek frakce 0/32 9,38*2 "Přepočtené koeficientem množství Součet	t	18,760 18,760 18,760	345,50	6 481,58	CS ÚRS 2020 01
15	K	181006112-R	Rozprostření zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5 tloušťka vrstvy přes 0,10 do 0,15 m Poznámka k položce: Poznámka k položce: Včetně dodávky zeminy	m2	15,500	65,10	1 009,05	CS ÚRS 2020 01
16	K	181102302	Úprava pláně na stavbách dálnic v zářezích mimo skalních se zhuťněním	m2	618,000	25,60	15 820,80	CS ÚRS 2020 01
17	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5 viz C.2.2 (2+24,5+2,25+2,25)*0,5 Součet	m2	15,500 15,500 15,500	36,70	568,85	CS ÚRS 2020 01
18	M	005724100	Osiva pícnin směsí travní balení obvykle 25 kg parková 15,5*0,015 "Přepočtené koeficientem množství Součet	kg	0,233 0,233 0,233	119,50	27,84	CS ÚRS 2020 01
19	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	15,500	5,00	77,50	CS ÚRS 2020 01
							428 584,90	
20	K	564851111	Komunikace pozemní Podklad ze šterkodrti SD s rozprostřením a zhuťněním, po zhuťnění tl. 150 mm viz C.2.2 6*3*2 (2*3,5+3)*2 Součet	m2	56,000 36,000 20,000 56,000	186,00	10 416,00	CS ÚRS 2020 01
21	K	564861111	Podklad ze šterkodrti SD s rozprostřením a zhuťněním, po zhuťnění tl. 200 mm viz C.2.2 224*1,85 87*1,85 -56 Součet	m2	519,350 414,400 160,950 -56,000 519,350	220,00	114 257,00	CS ÚRS 2020 01
22	K	565211111	Podklad ze šterku částečně zpevněného cementovou maltou ŠCM s rozprostřením a s hutněním, po zhuťnění tl. 150 mm viz C.2.2 6*3*1,85 (2*3,5+3)*1,85 Součet	m2	51,800 33,300 18,500 51,800	297,00	15 384,60	CS ÚRS 2020 01
25	K	596211113	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, na plochu přes 300 m2 viz C.2.2 224*1,85 87*1,85 Mezisoučet 6*3*1,85*(-1) (2*3,5+3)*1,85*(-1) Mezisoučet Součet	m2	523,550 414,400 160,950 575,350 -33,300 -18,500 -51,800 523,550	258,00	135 075,90	CS ÚRS 2020 01
26	M	59245006	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná viz C.2.2 a B.6 2,4+2,6+3,1+3,1+0,9 6*3*0,4+6*2*0,4 (2*3,5+3)*0,4+3*2*0,4 Součet	m2	30,500 12,100 12,000 6,400 30,500	445,00	13 572,50	CS ÚRS 2020 01
27	M	59245021	dlažba tvar čtverec betonová 200x200x60mm přírodní 523,55-30,5 Součet	m2	493,050 493,050 493,050	238,00	117 345,90	CS ÚRS 2020 01
28	K	596212211	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, na plochu přes 50 do 100 m2 viz C.2.2 6*3*1,45 (2*3,5+3)*1,45 Součet	m2	40,600 26,100 14,500 40,600	270,00	10 962,00	CS ÚRS 2020 01
29	M	59245030	dlažba tvar čtverec betonová 200x200x80mm přírodní 40,6 Součet	m2	40,600 40,600 40,600	285,00	11 571,00	CS ÚRS 2020 01
							26 150,00	
31	K	899331111	Trubní vedení Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	2,000	2 050,00	4 100,00	CS ÚRS 2020 01
32	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu bez úprav amatur	kus	21,000	1 050,00	22 050,00	CS ÚRS 2020 01
							154 886,50	
33	K	914111111	Ostatní konstrukce a práce, bourání Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 obličkami na sloupky nebo konzoly	kus	3,000	205,00	615,00	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
34	M	40445621	informativní značky provozní IP1-IP3, IP4b-IP7, IP10a, b 500x500mm	kus	1,000	850,00	850,00	CS ÚRS 2020 01
35	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky	kus	1,000	1 085,00	1 085,00	CS ÚRS 2020 01
36	M	40445235	sloupek pro dopravní značku AI D 60mm v 3,5m	kus	1,000	425,00	425,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
39	K	916131213 - R	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 20/25 n XF3 do lože z betonu prostého téže značky viz C.2.2 a C.4	m	311,000	268,00	83 348,00	
	VV		224+87		311,000			
	VV		Součet		311,000			
40	M	59217029	obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm	m	31,000	118,00	3 658,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		viz C.2.2					
	VV		6*3		18,000			
	VV		2*3,5+3		10,000			
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		31,000			
41	M	59217030	obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm	m	20,000	325,00	6 500,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		6+2+1+1		10,000			
	VV		Součet		10,000			
	VV		10*2 *Přepočtené koeficientem množství		20,000			
	VV		Součet		20,000			
42	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	260,000	120,00	31 200,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		311		311,000			
	VV		-31		-31,000			
	VV		-20		-20,000			
	VV		Součet		260,000			
43	K	916231213-R	Osazení chodnikového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 16/20 n XF1 do lože z betonu prostého téže značky viz C.2.2	m	31,000	209,50	6 494,50	CS ÚRS 2020 01
	VV		2+24,5+2,25+2,25		31,000			
	VV		Součet		31,000			
44	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	31,000	111,00	3 441,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		31		31,000			
	VV		Součet		31,000			
45	K	916991121-R	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého tř. C 20/25 n XF3	m3	6,840	2 500,00	17 100,00	CS ÚRS 2020 01
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: doplnění k jednotádce viz C.2.2					
	VV		311*0,1*0,2		6,220			
	VV		31*0,1*0,2		0,620			
	VV		Součet		6,840			
48	K	966006211	Odstranění (demonťáž) svislých dopravních značek s odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze sloupů, sloupků nebo konzol	kus	2,000	85,00	170,00	CS ÚRS 2020 01
	D	997	Přesun sutě				147 094,23	
49	K	997221551	Vodorovná doprava sutě bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze syklých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	184,780	42,30	7 816,19	CS ÚRS 2020 01
	VV		viz sut URS					
	VV		180,38		180,380			
	VV		4,4		4,400			
	VV		Součet		184,780			
50	K	997221559	Vodorovná doprava sutě bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	3 141,260	9,70	30 470,22	CS ÚRS 2020 01
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Předpokládána celková trasa odvozu 18 km					
	VV		180,38		180,380			
	VV		4,4		4,400			
	VV		Součet		184,780			
	VV		184,78*17 *Přepočtené koeficientem množství		3 141,260			
	VV		Součet		3 141,260			
51	K	997221561	Vodorovná doprava sutě bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	199,670	42,30	8 446,04	CS ÚRS 2020 01
	VV		viz sut URS					
	VV		135,915		135,915			
	VV		63,755		63,755			
	VV		Součet		199,670			
52	K	997221569	Vodorovná doprava sutě bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	3 394,390	9,70	32 925,58	CS ÚRS 2020 01
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Předpokládána celková trasa odvozu 18 km					
	VV		135,915		135,915			
	VV		63,755		63,755			
	VV		Součet		199,670			
	VV		199,67*17 *Přepočtené koeficientem množství		3 394,390			
	VV		Součet		3 394,390			
53	K	997221645	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	4,400	350,00	1 540,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		viz sut URS					
	VV		4,4		4,400			
	VV		Součet		4,400			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
54	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	199,670	190,00	37 937,30	CS ÚRS 2020 01
	VV		viz sůl URS					
	VV		135,915		135,915			
	VV		63,755		63,755			
	VV		Součet		199,670			
55	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	180,380	155,00	27 958,90	CS ÚRS 2020 01
	VV		viz sůl URS					
	VV		180,38		180,380			
	VV		Součet		180,380			
D	998		Přesun hmot				97 907,20	
56	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délkou objektu	t	520,783	188,00	97 907,20	CS ÚRS 2020 01
D	PSV		Práce a dodávky PSV				25 562,21	
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				25 562,21	
57	K	711161212	Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše svislé S vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní výška nooku 8.0 mm. tl. fólie do soklové zdivo a podezdívky 0,5*(192,5+81,8)	m2	137,150	186,00	25 509,90	CS ÚRS 2020 01
	VV		Součet		137,150			
	VV				137,150			
58	K	998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výškov. do 6 m	t	0,055	951,00	52,31	CS ÚRS 2020 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Wolkerova

Objekt:

170A15 - Rekonstrukce chodníku podél MK Wolkerova v Hulíně (úsek II. KM 0,000-0,307)

Soupis:

Způsobilé - Způsobilé výdaje projektu

Úroveň 4:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO: 822 27 33

Místo:

CC-CZ:

Datum:

23. 4. 2020

Zadavatel:

Město Hulín

IČ:

00287229

DIČ:

CZ00287229

Uchazeč:

Správa a údržba silnic Kroměřížska s.r.o., Kotojedy 56, Kroměříž 76701

IČ:

26908298

DIČ:

CZ26908298

Projektant:

Ing. Ondřej Adamík

IČ:

04625170

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

34 390,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	34 390,00	21,00%	7 221,90
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

41 611,90

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

MĚSTO HULÍN

768 24 Hulín, nám. Míru 162

IČ: 00287229, DIČ: CZ00287229

Správa a údržba silnic Kroměřížska, s.r.o.

Kotojedy 56

767 01 KROMĚŘÍŽ

-11-

Datum a podpis:

12.01.2020

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Volkerova

Objekt:

17OA15 - Rekonstrukce chodníku podél MK Volkerova v Hulíně (úsek II. KM 0,000-0,307)

Soupis:

Způsobilé - Způsobilé výdaje projektu

Úroveň 4:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Datum:

23. 4. 2020

Zadavatel:

Město Hulín

Projektant:

Ing. Ondřej
Adamík

Uchazeč:

Správa a údržba silnic Kroměřížska s.r.o. , Kotojedy 56, Kroměříž 76 Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

34 390,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

34 390,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	11 140,00
VRN3 - Zařízení staveniště	10 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	8 250,00
VRN9 - Ostatní náklady	5 000,00

P	Poznámka k položke: výdaje na povinné informační a propagační nástroje podle kap. 13 Obecných pravidel
---	--

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Wolkerova
Objekt:
17OA15 - Rekonstrukce chodníku podél MK Wolkerova v Hulíně (úsek II. KM 0,000-0,307)
Soupis:
Nezpůsobilé - Nezpůsobilé výdaje projektu
Úroveň 3:

SO102.1 - Chodník - Úsek II KM 0,000-0,307 NEUZNATELNÉ NÁKLADY

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 23. 4. 2020
Zadavatel:	IČ:
	DIČ:
Uchazeč:	IČ: 26908298
Správa a údržba silnic Kroměřížska s.r.o., Kotojedy 56, Kroměříž 76701	DIČ: CZ26908298
Projektant:	IČ:
	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
	DIČ:
Poznámka:	

Cena bez DPH	218 416,88		
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	218 416,88	21,00%	45 867,54
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		264 284,42

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

MĚSTO HULÍN
768 24 Hulín, nám. Míru 162
IČ: 00287229, DIČ: CZ00287229

Správa a údržba silnic Kroměřížska, s.r.o.
Kotojedy 56
767 01 KROMĚŘÍŽ -11-
IČO 26908298, DIČ CZ26908298

Datum a podpis: 12.01.2020 Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Wolkerova

Objekt:

170A15 - Rekonstrukce chodníku podél MK Wolkerova v Hulíně (úsek II. KM 0,000-0,307)

Soupis:

Nezpůsobilé - Nezpůsobilé výdaje projektu

Uroveň 3:

SO102.1 - Chodník - Úsek II KM 0,000-0,307 NEUZNATELNÉ NÁKLADY

Místo:

Datum:

23. 4. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Správa a údržba silnic Kroměřížska s.r.o., Kotojedy 56, Kroměříž 767 Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

218 416,88

HSV - Práce a dodávky HSV

218 416,88

1 - Zemní práce

14 928,00

5 - Komunikace pozemní

45 561,50

8 - Trubní vedení

12 000,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

127 533,33

997 - Přesun sutě

10 557,08

998 - Přesun hmot

7 836,97

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Wolkerova
 Objekt: 17OA15 - Rekonstrukce chodníku podél MK Wolkerova v Hulíně (úsek II. KM 0,000-0,307)
 Soupis: Nezpůsobilé - Nezpůsobilé výdaje projektu
 Úroveň 3:

SO102.1 - Chodník - Úsek II KM 0,000-0,307 NEUZNATELNÉ NÁKLADY

Místo: Datum: 23. 4. 2020
 Zadavatel: Projektant:
 Uchazeč: Správa a údržba silnic Kroměřížska s.r.o., Kotojedy 56, Kroměříž 767 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							218 416,88	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				218 416,88	
D	1		Zemní práce				14 928,00	
1	K	113154113	Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 50 mm viz C.2.2 a C.4 (224+87)*0,375	m2	116,625	128,00	14 928,00	CS ÚRS 2020 01
	vv		Součet		116,625		14 928,00	
D	5		Komunikace pozemní				45 561,50	
2	K	573231111	Postřik živичný spojovací bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství od 0,50 do 0,80 ka/m2 viz C.2.2 (224+87)*0,25	m2	77,750	28,00	2 177,00	CS ÚRS 2020 01
	vv		Součet		77,750		2 177,00	
3	K	577134131	Asfaltový beton vrstva ohrnsná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhuťněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhuťnění tl. 40 mm viz C.2.2	m2	77,750	558,00	43 384,50	CS ÚRS 2020 01
	vv		Součet		77,750		43 384,50	
D	8		Trubní vedení				12 000,00	
4	K	899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže	kus	6,000	2 000,00	12 000,00	CS ÚRS 2020 01
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				127 533,33	
5	K	916111122-R	Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou z drobných kostek bez boční opěry, do lože z betonu prostého tř. C 20/25 viz C.2.2	m	311,000	168,00	52 248,00	CS ÚRS 2020 01
	vv		Součet		311,000		52 248,00	
6	M	58381007	kostka dlažební žula drobná 8/10	m2	38,875	551,00	21 420,13	CS ÚRS 2020 01
	vv		Součet		38,875		21 420,13	
7	K	919112222	Rezáni dilatačních spár v živичném krytu vytvoření komůrky pro těsnící závluku šířky 15 mm, hloubky 25 mm viz C.2.2	m	311,000	54,20	16 856,20	CS ÚRS 2020 01
	vv		Součet		311,000		16 856,20	
8	K	919122121	Utěsnění dilatačních spár závlukou za tepla v cementobetonovém nebo živичném krytu včetně adhezivního nátěru z těsnicím profilem pod závlukou, pro komůrky šířky 15 mm, hloubky 25 mm	m	311,000	119,00	37 009,00	CS ÚRS 2020 01
D	997		Přesun sutě				10 557,08	
9	K	997221551	Vodorovná doprava sutě bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km viz sut' URS	t	14,928	42,30	631,45	CS ÚRS 2020 01
	vv		Součet		14,928		631,45	
10	K	997221559	Vodorovná doprava sutě bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i za počít 1 km přes 1 km	t	253,776	9,70	2 461,63	CS ÚRS 2020 01
	vv		Součet		253,776		2 461,63	
13	K	997221645	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 viz sut' URS	t	14,928	500,00	7 464,00	CS ÚRS 2020 01
	vv		Součet		14,928		7 464,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	998	Přesun hmot				7 836,97	
16	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytém dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	41,686	188,00	7 836,97	CS ÚRS 2020 01

h.

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Wolkerova
Objekt: 17OA15 - Rekonstrukce chodníku podél MK Wolkerova v Hulíně (úsek II. KM 0,000-0,307)
Soupis: Nezpůsobilé - Nezpůsobilé výdaje projektu

Úroveň 3:
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO: 822 27 33
Místo:

CC-CZ:
Datum: 23. 4. 2020

Zadavatel:
Město Hulín

IČ: 00287229
DIČ: CZ00287229

Uchazeč:
Správa a údržba silnic Kroměřížska s.r.o., Kotojedy 56, Kroměříž 76701

IČ: 26908298
DIČ: CZ26908298

Projektant:
Ing. Ondřej Adamík

IČ: 04625170
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		13 475,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	13 475,00	21,00%	2 829,75
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	16 304,75

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

MĚSTO HULÍN

768 24 Hulín, nám. Míru 162

Správa a údržba silnic Kroměřížska, s.r.o.

Kotojedy 56

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Wolkerova
Objekt: 17OA15 - Rekonstrukce chodníku podél MK Wolkerova v Hulíně (úsek II. KM 0,000-0,307)
Soupis: Nezpůsobilé - Nezpůsobilé výdaje projektu
Úroveň 3: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Datum: 23. 4. 2020
Zadavatel: Město Hulín Projektant: Ing. Ondřej Adamík
Uchazeč: Správa a údržba silnic Kroměřížska s.r.o., Kotojedy 56, Kroměříž 767 Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	13 475,00
M - Práce a dodávky M	475,00
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	475,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	13 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	2 500,00
VRN3 - Zařízení staveniště	10 500,00

6.

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Wolkerova
Objekt: 17OA15 - Rekonstrukce chodníku podél MK Wolkerova v Hulíně (úsek II. KM 0,000-0,307)
Soupis: Nezpůsobilé - Nezpůsobilé výdaje projektu
Uroveň 3: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Datum: 23. 4. 2020
Zadavatel: Město Hulín Projektant: Ing. Ondřej Adámek
Uchazeč: Správa a údržba silnic Kroměřížska s.r.o., Kotojedy 56, Kroměříž 767 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							13 475,00	
D	M		Práce a dodávky M				475,00	
D	46-M		Zemní práce při extr.mont.pracích				475,00	
1	K	460010025	Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru	km	0,307	1 547,23	475,00	CS ÚRS 2020 01
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou zahrnuty i náklady na: a) pochůzky projektovanou trasou, b) vyznačení budoucí trasy, c) rozmístění, očíslování a označení opěrných bodů, d) označení překážek a míst pro kabelové prostupy a podchodové štoly.								
PSC								
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				13 000,00	
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				2 500,00	
2	K	012203000	Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce při provádění stavby	soub.	1,000	2 500,00	2 500,00	CS ÚRS 2020 01
Poznámka k položce: Vytyčení hlavních bodů trasy								
P								
D	VRN3		Zařízení staveniště				10 500,00	
3	K	030001000	Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště	soub.	1,000	10 500,00	10 500,00	CS ÚRS 2020 01
Poznámka k položce: mobilní WC, oplocení, buňka stavbyvedoucího ... vč. nákladů na provoz zařízení staveniště vč. nákladů na odstranění zařízení staveniště								
P								


Harmonogram stavby: 1449B HULÍN - Rekonstrukce chod.ul.Wolkerova

Zhotovitel : Správa a údržba silnic Kroměřížska , s.r.o.
Kotojedy 56
76701 Kroměříž

Číslo	Název	Začátek činnosti	Konec činnosti	Cena (Kč)	Nh	Počet prac. dní	Prům. počet prac.	březen 2021	duben 2021				květen 2021		
								4	1	2	3	4	1	2	3
1449B	HULÍN - Rekonstrukce chod.ul.Wolkerova	01.04.2021	10.05.2021	1 348 727	1 102	28	6		116	113	262	439	157	16	
01	VRN 2	01.04.2021	10.05.2021	13 475	0	28	6		0	0	0	0	0	0	
5a	VRN 2	01.04.2021	10.05.2021	13 475	0	28	6		0	0	0	0	0	0	
46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích	01.04.2021	10.05.2021	475	0	28	6		0	0	0	0	0	0	
VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce	01.04.2021	10.05.2021	2 500	0	28	6		0	0	0	0	0	0	
VRN3	Zařízení staveniště	01.04.2021	10.05.2021	10 500	0	28	6		0	0	0	0	0	0	
102	Chodník - Usek II KM 0,000-0,307	01.04.2021	10.05.2021	1 082 445	1 007	28	6		105	109	259	386	133	15	
2a	Chodník - Usek II KM 0,000-0,307	01.04.2021	10.05.2021	1 082 445	1 007	28	6		105	109	259	386	133	15	
1	Zemní práce	01.04.2021	07.05.2021	202 260	362	27	6		68	68	68	88	68		
5	Komunikace pozemní	15.04.2021	30.04.2021	428 585	277	12	6				121	156			
8	Trubní vedení	26.04.2021	30.04.2021	26 150	40	5	6					40			
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	14.04.2021	07.05.2021	154 887	101	18	6			4	30	38	30		
997	Přesun sutě	01.04.2021	23.04.2021	147 094	2	17	6		1	1	1	0			
998	Přesun hmot	01.04.2021	10.05.2021	97 907	203	28	6		36	36	36	46	36	15	
711	Izolace proti vodě	21.04.2021	26.04.2021	25 562	22	4	6				4	18			
02	VRN	01.04.2021	10.05.2021	34 390	0	28	6		0	0	0	0	0	0	
3a	VRN	01.04.2021	10.05.2021	34 390	0	28	6		0	0	0	0	0	0	
VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce	01.04.2021	10.05.2021	8 640	0	28	6		0	0	0	0	0	0	
VRN3	Zařízení staveniště	01.04.2021	10.05.2021	12 500	0	28	6		0	0	0	0	0	0	
VRN4	Inženýrská činnost	01.04.2021	10.05.2021	8 250	0	28	6		0	0	0	0	0	0	
VRN9	Ostatní náklady	01.04.2021	10.05.2021	5 000	0	28	6		0	0	0	0	0	0	
102.1	Chodník-neuznatelné náklady	01.04.2021	10.05.2021	218 417	96	28	6		11	4	3	53	24	1	
4a	Chodník-neuznatelné náklady	01.04.2021	10.05.2021	218 417	96	28	6		11	4	3	53	24	1	
1	Zemní práce	01.04.2021	08.04.2021	14 928	9	6	6		8	1					
5	Komunikace pozemní	03.05.2021	07.05.2021	45 562	0	5	6						0		
8	Trubní vedení	26.04.2021	30.04.2021	12 000	23	5	6					23			
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	26.04.2021	04.05.2021	127 533	47	7	6					26	21		
997	Přesun sutě	01.04.2021	16.04.2021	10 557	0	12	6		0	0	0				
998	Přesun hmot	01.04.2021	10.05.2021	7 837	16	28	6		3	3	3	4	3	1	
	Nh za měsíc							0			929			174	
	Nh za rok											1 102			


Harmonogram stavby: 1449B HULÍN - Rekonstrukce chod.ul.Wolkerova										
Zhotovitel :		Správa a údržba silnic Kroměřížska , s.r.o.								
		Kotojedy 56								
76701		Kroměříž								
Číslo	Název	Začátek činnosti	Konec činnosti	Cena (Kč)	Nh	Počet prac.	Prům. počet	2 021		
								březen	duben	květen
1449B	HULÍN - Rekonstrukce chod.ul.Wolkerov	01.04.2021	10.05.2021	1 348 727	1 102	28	6		1 124 641	224 086
01	VRN 2	01.04.2021	10.05.2021	13 475	0	28	6		10 106	3 369
5a	VRN 2	01.04.2021	10.05.2021	13 475	0	28	6		10 106	3 369
46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích	01.04.2021	10.05.2021	475	0	28	6		356	119
VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové prá	01.04.2021	10.05.2021	2 500	0	28	6		1 875	625
VRN3	Zařízení staveniště	01.04.2021	10.05.2021	10 500	0	28	6		7 875	2 625
102	Chodník - Úsek II KM 0,000-0,307	01.04.2021	10.05.2021	1 082 445	1 007	28	6		974 527	107 917
2a	Chodník - Úsek II KM 0,000-0,307	01.04.2021	10.05.2021	1 082 445	1 007	28	6		974 527	107 917
1	Zemní práce	01.04.2021	07.05.2021	202 260	362	27	6		163 994	38 265
5	Komunikace pozemní	15.04.2021	30.04.2021	428 585	277	12	6		428 585	
8	Trubní vedení	26.04.2021	30.04.2021	26 150	40	5	6		26 150	
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	14.04.2021	07.05.2021	154 887	101	18	6		109 711	45 175
997	Přesun sutě	01.04.2021	23.04.2021	147 094	2	17	6		147 094	
998	Přesun hmot	01.04.2021	10.05.2021	97 907	203	28	6		73 430	24 477
711	Izolace proti vodě	21.04.2021	26.04.2021	25 562	22	4	6		25 562	
02	VRN	01.04.2021	10.05.2021	34 390	0	28	6		25 793	8 598
3a	VRN	01.04.2021	10.05.2021	34 390	0	28	6		25 793	8 598
VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové prá	01.04.2021	10.05.2021	8 640	0	28	6		6 480	2 160
VRN3	Zařízení staveniště	01.04.2021	10.05.2021	12 500	0	28	6		9 375	3 125
VRN4	Inženýrská činnost	01.04.2021	10.05.2021	8 250	0	28	6		6 188	2 063
VRN9	Ostatní náklady	01.04.2021	10.05.2021	5 000	0	28	6		3 750	1 250
102.1	Chodník-neuznatelné náklady	01.04.2021	10.05.2021	218 417	96	28	6		114 215	104 202
4a	Chodník-neuznatelné náklady	01.04.2021	10.05.2021	218 417	96	28	6		114 215	104 202
1	Zemní práce	01.04.2021	08.04.2021	14 928	9	6	6		14 928	
5	Komunikace pozemní	03.05.2021	07.05.2021	45 562	0	5	6			45 562
8	Trubní vedení	26.04.2021	30.04.2021	12 000	23	5	6		12 000	
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	26.04.2021	04.05.2021	127 533	47	7	6		70 852	56 681
997	Přesun sutě	01.04.2021	16.04.2021	10 557	0	12	6		10 557	
998	Přesun hmot	01.04.2021	10.05.2021	7 837	16	28	6		5 878	1 959
	Cena za měsíc							0	1 124 641	224 086
	Cena za rok								1 348 727	

Finanční harmonogram

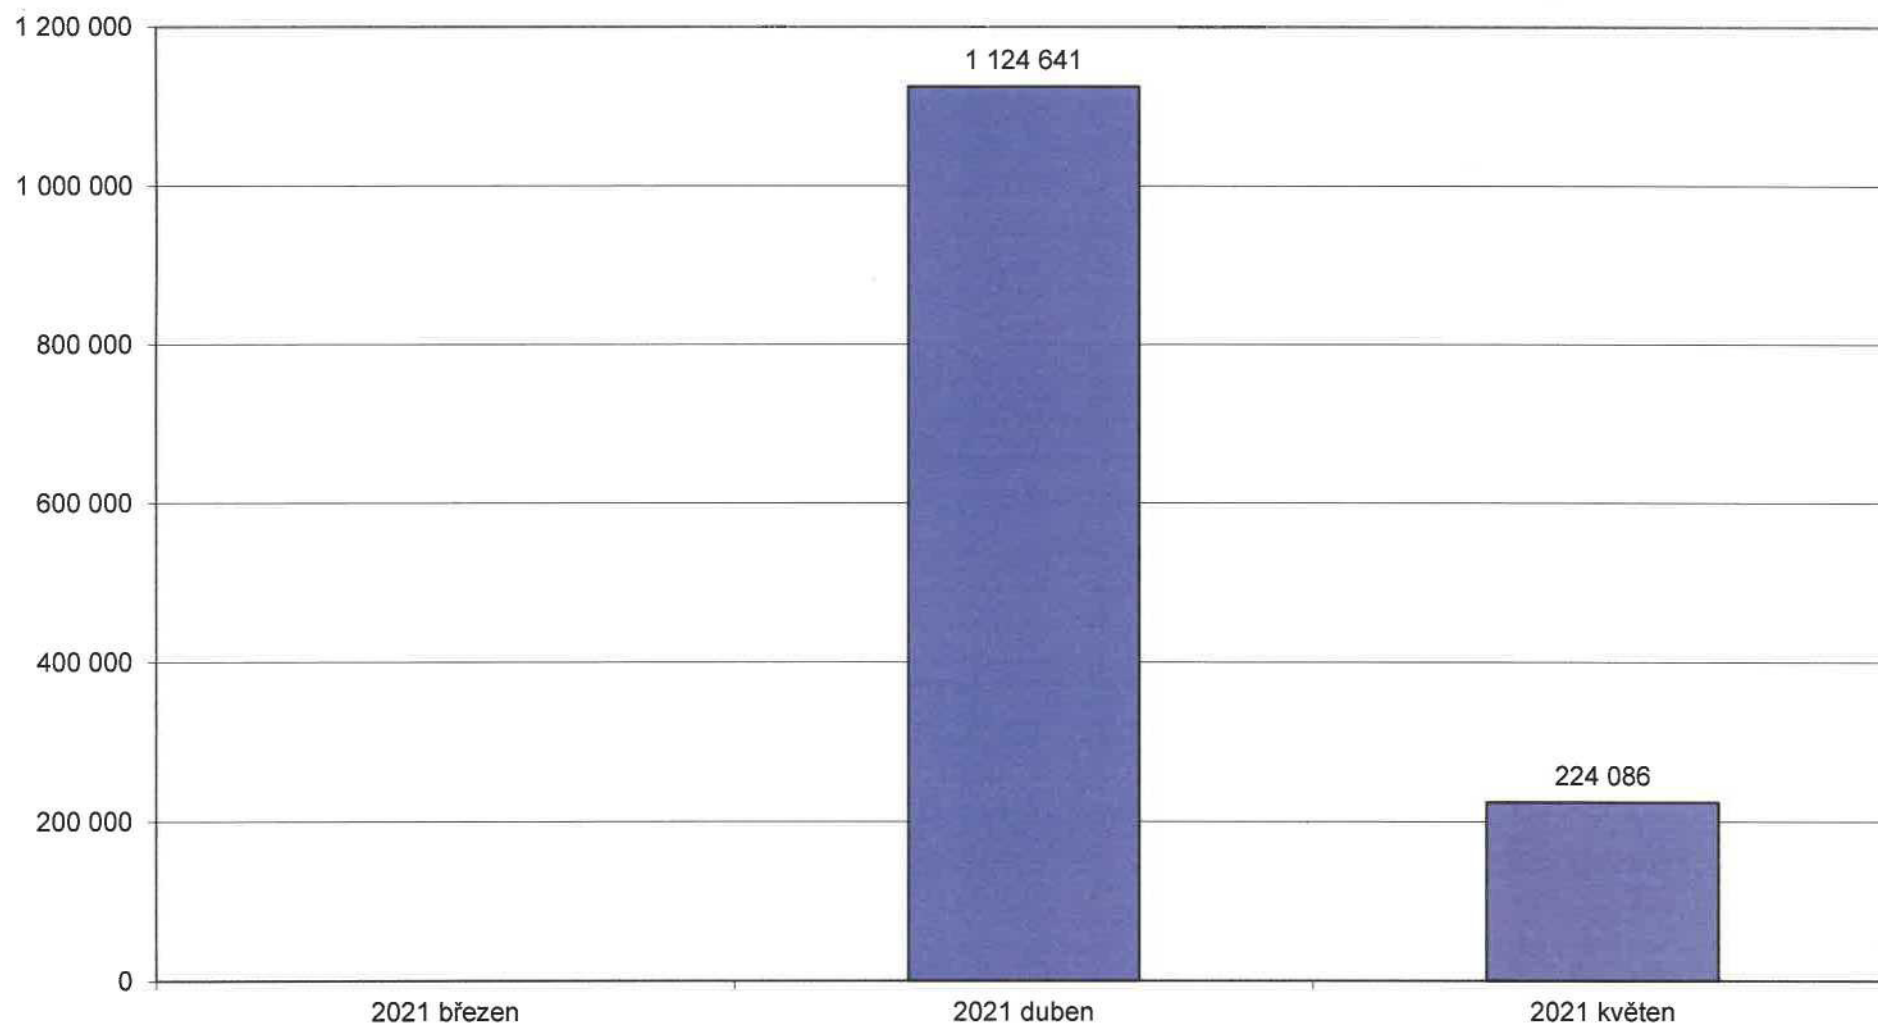

2

Součtový finanční harmonogram

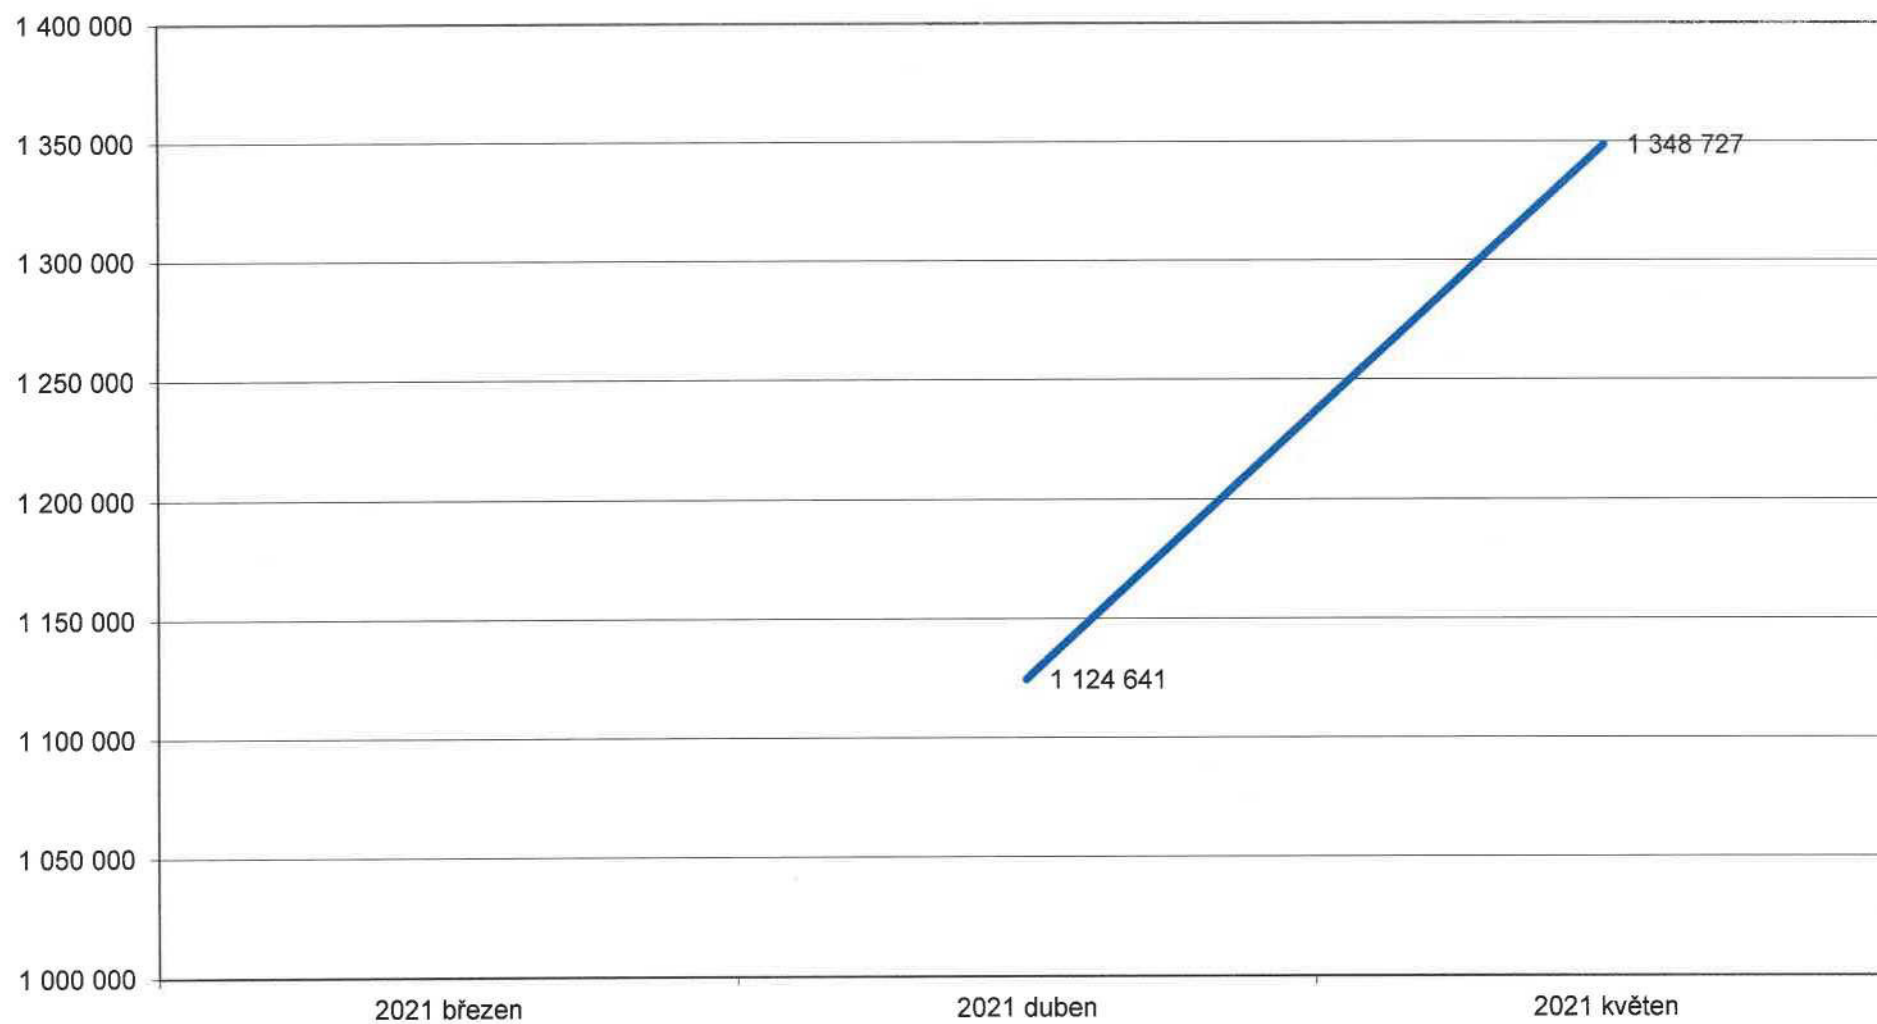

Seznam poddodavatelů

Název veřejné zakázky:	Popis části plnění, kterou uchazeč zadá subdodavateli	% podíl na plnění VZ
„Rekonstrukce chodníku podél MK Wolkerova v Hulíně – úsek II – 1. etapa“		

Identifikace poddodavatele:			Zeměměřičská činnost Geodetické práce	2,04 %
1.	Název:	Ing. Jindřich Malát		
	Sídlo:	Třasoňova 3344/8A 767 01 Kroměříž		
	Tel./fax:	602 530 347		
	E-mail:	jindrich.malat@seznam.cz		
	IČ:	67504469		
	DIČ:	CZ530529327		
	Spisová značka v obch. rejstříku:	---		
	Osob oprávněná k jednání:	Ing. Jindřich Malát		

Celkový objem poddodávek	2,04 %
--------------------------	--------

V Kroměříži, dne 11.01.2021

Správa a údržba silnic Kroměřížska, s.r.o.
Kotojedy 56
767 01 KROMĚŘÍŽ -11-
IČO 26908298, DIČ CZ26908298



.....
Ing. Emil Vraník
jednatel společnosti

6.

POŽADAVKY OBJEDNATELE NA PRAVIDLA REALIZACE PŘEDMĚTU ZAKÁZKY

1. POVINNÁ IDENTIFIKACE PRACOVNÍKŮ

- Objednatel požaduje jednotnou, jednoznačnou a viditelnou identifikaci všech pracovníků na stavbě.
- Požadavek na jednotnou identifikaci pracovníků se vztahuje na všechny pracovníky po celou dobu stavby, tedy i na pracovníky subdodavatelů.
- Požadavek na jednotnou identifikaci pracovníků se vztahuje na všechny pracovníky po celou dobu stavby, tedy i na pracovníky pracující v extrémnějších podmínkách (např. výkopu).
- Požadavek na jednotnou identifikaci pracovníků se vztahuje na všechny pracovníky po celou dobu stavby, tedy i na pracovníky, kteří vstupují na staveniště za účelem plnění krátkodobého úkolu (např. pracovníci zajišťující dovoz a odvoz materiálu na staveniště).
- Zhotovitel musí zohlednit skutečnosti uvedené výše a zvolit vhodný způsob identifikace.
- Zhotovitel seznámí všechny zúčastněné strany se způsobem jednoznačné identifikace na společném koordinačním jednání.
- Koordinátor BOZP je oprávněn navrhnout Objednateli sankci vůči Zhotoviteli za nesplnění tohoto opatření.

2. MIMOŘÁDNÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Zhotovitel má povinnost:

- Zajištění zamezení přístupu nepovolaným osobám na staveniště.
- Zajištění všech potřebných úklidových prací.
- Přístupy vně staveniště ve frekventovaných místech ohrazení neprůhledné.

3. JEDNOLITOST VZHLEDU REALIZOVANÉHO DÍLA

- Zhotovitel je povinen respektovat požadavek jedolitého vzhledu celého realizovaného díla.
- Odsouhlasené vzorky budou uloženy do depozitáře Objednatele na staveništi.
- Objednatel požaduje jednolitost vzhledu celého díla.

4. FOTODOKUMENTACE

Způsob zpracování fotodokumentace

- Členění fotodokumentace po jednotlivých objektech a dotčených plochách opatřené samostatnými seznamy pořízené fotodokumentace.
- Každý snímek bude opatřen aktuálním datem pořízení.

Užití fotodokumentace

- Jedno aktuální rozpracované vyhotovení fotodokumentace bude po celou dobu stavby na staveništi k okamžité dispozici Objednateli a ostatním zástupcům zúčastněných stran.

Fotodokumentace stávajícího stavu před zahájením stavebních prací

- Bude sloužit jako součást pasportizace.
- Bude po celou dobu k dispozici Objednateli a zástupcům TDO na staveništi.

- Fotodokumentace v rozsahu celého zájmového území stavby bude rozčleněná na jednotlivé objekty, komunikace, zpevněné plochy, oplocení, travnaté plochy, zeleně, stálé dopravní značení apod.

Fotodokumentace průběhu stavby

- K zakrývaným konstrukcím,
- K sítím a přípojkám před záhozem,
- K dodržení předepsaných technologií,
- K dodržení bezpečnostních opatření,
- K prokázání zařízení staveniště,
- K prokázání užitých materiálů, výrobků a technologií,
- K prokázání všech činností, které jsou specifikovány jako vedlejší a ostatní náklady,
- K prokázání ostatních činností dopravy, odvozu sutí, apod.

Fotodokumentace po ukončení realizace

- Zhotovitel pořídí a předá Objednateli fotodokumentaci dokončeného díla.

Způsob odevzdání fotodokumentace Objednateli

- Po dokončení stavby Zhotovitel předá kompletní fotodokumentaci opatřenou seznamem (2x CD a 1x tisk) Objednateli jako součást jednoho vyhotovení Dokumentace skutečného provedení stavby. Neodevzdání kompletní fotodokumentace bude důvodem k nepřevzetí dokončené stavby.

5. DOPRAVNÍ OMEZENÍ A INFORMACE

- Zhotovitel navrhne s ohledem na ZOV přechodné dopravní značení a staveništní dopravu.
- Zhotovitel zakreslí řádně do přehledné situace a projedná s dotčenými orgány před společným koordinačním jednáním.

6. SOUČINNOST S OBJEDNATELEM

ZAŠKOLENÍ OBJEDNATELE

- Objednatel klade důraz na součinnost Zhotovitele v rámci zaškolení personálu Objednatele ve věci technologie v rámci díla instalované nebo dotčené.
- Termíny jednotlivých proškolení smluvní strany dohodnou v dostatečném předstihu a za účasti všech stran se termíny uvedou do zápisu z kontrolních dní.
- Všechny návody a manuály je povinen Zhotovitel předložit obsluze výhradně v českém jazyce, a to již ve fázi proškolení.
- Souhrn těchto návodů a manuálů, opatřený seznamem, bude předán Objednateli v rámci přejímacího řízení, a to výhradně v českém jazyce v 4 vyhotoveních.
- Protokol o zaškolení personálu Objednatele předá Zhotovitel Objednateli nejpozději 1 kalendářní den před dnem odevzdání a převzetí dokončeného díla. Bez tohoto dokladu se nepovažuje dílo za dokončené.

ŠKODY A ZTRÁTY (ODCIZENÍ MAJETKU)

- Za prokazatelně vzniklé škody na majetku a zjištěné ztráty zjištěné v období ode dne předání staveniště do podpisu Zápisu o odevzdání a převzetí staveniště ručí výhradně Zhotovitel.

- V případě vzniklých škod na cizím majetku Zhotovitel zajistí jejich odstranění na své náklady po předchozím projednání na kontrolním dni se zástupcem Objednatele.
- V případě ztráty (odcizení) majetku je Zhotovitel povinen ztrátu uhradit v plné výši.

DALŠÍ POŽADAVKY OBJEDNATELE:

- Objednatel si vyhrazuje právo na pořizování vlastní fotodokumentace v průběhu realizace.

CERTIFIKÁT O POJISTNÉM KRYTÍ K POJISTNÉ SMLOUVĚ

č. 3301 0614 20

Pojistitel: Colonnade Insurance S.A., se sídlem L-2350 Lucemburk, rue Jean Piret 1, Lucemburské velkovévodství, zapsaná v lucemburském Registre de Commerce et des Sociétés, registrační číslo B61605, jednající prostřednictvím
Colonnade Insurance S.A., organizační složka, se sídlem Na Pankráci 1683/127, 140 00 Praha 4, Česká republika, identifikační číslo 044 85 297, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 77229.

se sídlem: Na Pankráci 1683/127, 140 00 Praha 4, Česká republika.

POTVRZUJE, že

Pojištěný: Správa a údržba silnic Kroměřížska, s.r.o., zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 44644, IČ 269 08 298

se sídlem: Kotojedy 56, 767 01 Kroměříž, Česká republika.

je kryta pojištěním v následujícím rozsahu

1. Pojistná doba

Pojištění vznikne dnem	01/ 04/ 2020	a je sjednáno na pojistnou dobu, která skončí dnem	31/ 03/ 2021
------------------------	--------------	--	--------------

2. Rozsah a limity pojištění plnění

Celkový limit pojištění plnění pro pojištění ODPOVĚDNOSTI ZA ÚJMU z PROVOZNÍ ČINNOSTI a ODPOVĚDNOSTI ZA ÚJMU ZPŮSOBENOU VÝROBKEM	
20 000 000 Kč	za všechny pojistné události v průběhu pojistné doby
Sublimity	
20 000 000 Kč	OBEČNÁ POVINNOST K NÁHRADĚ věcné škody a osobní újmy vč. újmy na zdraví vůči třetí osobě
20 000 000 Kč	POVINNOST K NÁHRADĚ věcné škody a osobní újmy vč. újmy na zdraví způsobené VÝROBKEM
20 000 000 Kč	POVINNOST K NÁHRADĚ FINANČNÍ ŠKODY
Základní spoluúčast pro pojištění ODPOVĚDNOSTI ZA ÚJMU a ODPOVĚDNOSTI ZA ÚJMU ZPŮSOBENOU VÝROBKEM	
1 000 Kč	Spoluúčast z každé pojistné události

3. Územní rozsah pojištění

ČR + Slovenská republika

Další podmínky pojištění, sublimity pojištění plnění a spoluúčasti jsou uvedeny v pojistné smlouvě.

V Praze dne

Podpis:

Jméno:

Funkce:

Zuzana Kupcová

Team Leader and Liabilities Underwriter

COLONNADE
A FAIRFAX COMPANY

Colonnade Insurance S.A., organizační složka
Na Pankráci 1683/127, 140 00 Praha 4
IČ 044 85 297, DIČ CZ683752144 (025)
